

□ **공약달성 확인지표**


확인지표	단위	목표·실적		2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비고
연도별 재조성	개소	목표	8	-	2	2	2	2	정상추진
		실적	4	-	4	-	-	-	

□ **추진실적 (24. 6월말 현재)**

그간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 새말어린이공원 재조성 사업 완료 / '23. 5. ○ 통매바위, 다정, 여태말 어린이공원 재조성 사업 완료 / '23. 11. ~ 12.
이번 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공원조성계획 결정(변경) 및 행정절차 추진 / 24. 5. ○ 증척골어린이공원 재조성 사업 착공 / 24. 6. 25.



현장사진

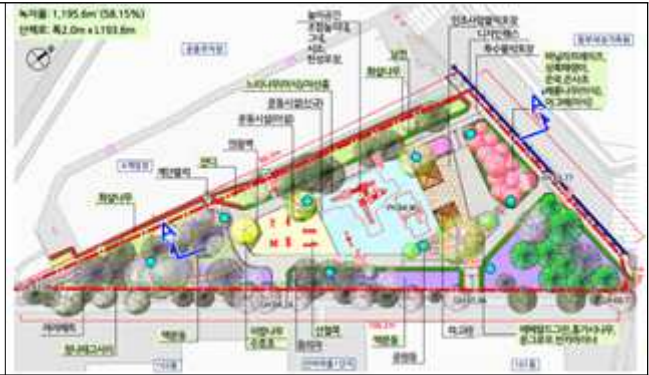

공원조성계획(안)

□ **향후 계획**

- '24. 6. 25. ~ 10. 22. : 사업 추진 및 완료
