


공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적		2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비고
설치수	건	목표	16	3	3	3	3	4	이행 후 계속추진
		실적	16	3	9	4	-	-	

추진실적

그간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 관계기관 의견 조회 및 현장조사('23.09.~11.) ○ 바닥신호등 설치공사(2차) 착공('23.11.27.) ○ 2023년 어린이보호구역 바닥신호등 설치공사(2차) 준공('23.12.18.) ○ 관계기관 의견 조회 및 현장조사('24.1.) ○ 2024년 어린이보호구역 바닥신호등 설치공사 착공('24.3.13.) ○ 2024년 어린이보호구역 바닥신호등 설치공사 준공('24.4.13.)
이번 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2025년 바닥신호등 설치 장소 현장조사('24.09.~12.)

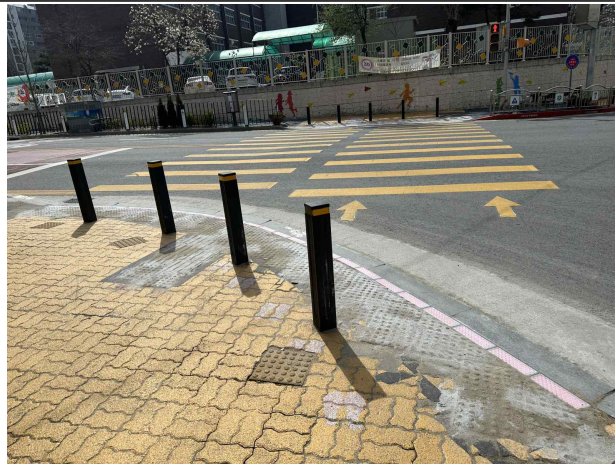

2024년 어린이보호구역(회덕초외 3개소) 바닥신호등 설치공사

문제점 및 대책

- 해당없음

향후 계획

- 2024.하반기 ~ 2026. 상반기 : 바닥신호등 설치 공사 추진
