

관리번호 1-1	대덕비전 TF 구성 · 운영				
-------------	-----------------	--	--	--	--

주관부서	기획홍보실	대덕비전팀장 정윤희 ☎ 608-6261	담당자 정윤희 ☎ 608-6261
------	-------	-----------------------	--------------------


사 업 구 분					총사업비 (백만원)	이 행 도						이행율 (%)
완료시기	사업기간	사업주체 (국가/市/자체)	신규 여부	국책 사업		완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기	
임기내	22~26년	자체	신규	×	비예산		○					100
중앙정부 도움 필요성					해당 없음 (√) / 도움 필요 제도() 재정() 권한()							

☐ 사업현황 및 정책목표

- 정부-市와 협력체계 구축을 위한 TF 구성으로 체계적 공약 대응
- 지역 주요발전 과제 집중관리를 통해 장기 숙원사업 해결방안 모색

☐ 사업개요

- (기간) 2022 ~ 2026년
- (내용) 공약 및 지역주요발전 과제 관련 10개 사업 전담 대응 TF 구성·운영
 - (구성) 2개 분과, 18~20명

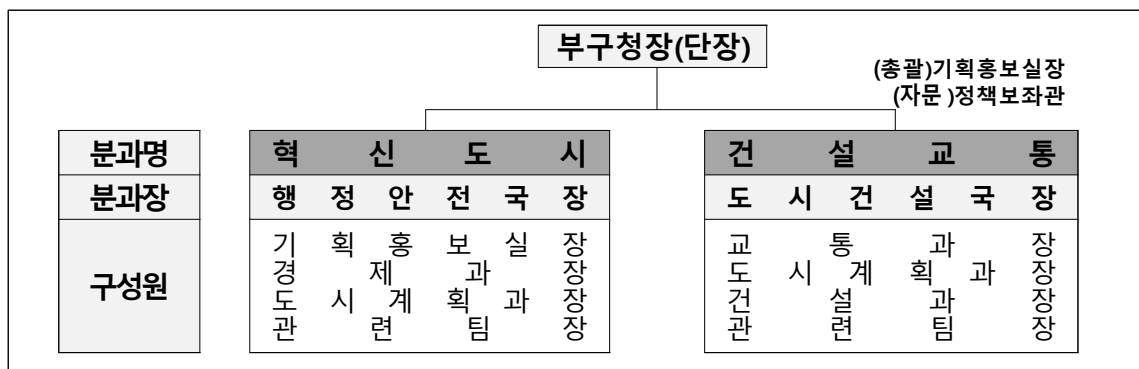

- (역할) 사업별 추진 로드맵 마련, 사업비 확보, 발전방안 도출 등

혁 신 도 시 분 과	① 조차장역 복합개발 ② 신대지구개발 계획 수립 ③ 연축지구 혁신도시 공공기관 이전 및 조기 활성화 ④ 대전산업단지 재창조 ⑤ 대전-세종 경제자유구역 지정
건 설 교 통 분 과	⑥ 경부선 철도 도심구간 지하화 ⑦ 도시철도 3호선 구축(신탄진~목상~산업단지구간 포함) ⑧ 트램노선 회덕역 연장 ⑨ 대전 제2외곽순환 고속도로 건설 ⑩ 외곽순환도로 조기착공(비래동~와동(연축), 와동(연축)~신탄진동, 문평~신탄진 도로개설)

- (운영) 분기별 정기회의, 반기별 보고회 등 개최

☐ 연차별 로드맵

구 분		2022		2023				2024				2025				2026		임기후	
단위사업	세부추진	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	26년 하반기	27년 이후
대덕비전TF 구성·운영	TF 구성 계획 수립																		
	사업별 로드맵 작성																		
	회의 및 보고회																		

☐ 연도별 투자계획 : 비예산

☐ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적		2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비 고
TF 구성	건	목표	1	1	-	-	-	-	완료
		실적	1	1	-	-	-	-	
TF 운영	회	목표	15	1	4	4	4	2	이행후 계속추진
		실적	8	-	4	4	-	-	

☐ 추진실적

그간 추진 실적	○ TF 구성 및 10대 장기발전과제 로드맵 작성(10대 사업 선정) : '22. 10월 ○ 대덕비전 TF 회의 개최 : 총 8회
이번 분기 추진 실적	○ 대덕비전 TF 8차 회의 개최 / '24. 12. 26.

☐ 향후 계획

○ 대덕비전 TF 10차 회의 개최 : 2025. 1분기

☐ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적		2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비 고
공영주차장 조성	개소	목표	1	-	-	-	1	-	정상추진
		실적	-	-	-	-	-	-	

☐ 추진실적

그간 추진 실적	○ 주민설명회 개최('23.07.05.) ○ 대덕구 경관심의 결과 알림(區 건축과)('23.10.11.) ○ 사업비 변경 계획 수립 / (당초) 30억 → (변경) 43억 ('23.11.06.) ○ 특정공법 선정 위원회 개최 및 공법 선정 / 토닉스틸(주)('23.11.29.) ○ 市 도시계획·건축공동위원회 심의결과 알림(원안수용)('24.03.04.) ○ 중리1지구 지구단위계획 결정(변경) 고시 완료(市 고시 제2024-67)('24.03.12.) ○ 중리1지구 도시관리계획(지구단위계획) 결정(변경) 용역(착수: '23.06.) 준공('24.03.26.) ○ 건축인허가 수리 및 실시계획인가 고시(區고시 제2024-45호)('24.4.15.) ○ 市 계약심사 및 區 일상감사 완료('24.5.27.~6.3.) ○ 건축·기계, 전기, 소방, 통신 등 공사 및 용역 발주 ○ 기본 및 실시설계 용역(착수: '23.4.) 완료('24.6.24.) ○ 공사 및 용역 착수('24. 07.) ○ 착공식 추진완료('24. 09.)
이번 분기 추진 실적	○ 장애물 없는 생활환경(BF) 본인증 용역 착수('24. 12.)

착 수 계	
사 업 명	중리미래 공영주차장 입체화사업 장애물 없는 생활환경(BF) 본인증 용역
계 약 년 월 일	2024년 12월 3일
계 약 금 액	금 일천이백오십사만 원(금 12,540,000 원)
계약수행기간	2024년 12월 3일 ~ 2025년 9월 28일
위의 사업을 성실히 수행하고자 착수계를 제출합니다.	
2024년 12월 3일	
주식회사 미래건축전략연구소 대표이사 : 가. 홍 회 (인)	
대전광역시 대덕구 (분임)제무관 귀하	

용역 착수		
-------	--	--

☐ 문제점 및 대책 / 해당없음

☐ 향후 계획

○ '25. 09. : 준공 예정


[illegible]

☐ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비 고
설 치 수	건	목표	16	3	3	3	4	이행 후 계속추진
		실적	16	3	4	-	-	

☐ 추진실적

그간 추진 실적	○ 관계기관 의견 조회 및 현장조사('23.09.~11.) ○ 바닥신호등 설치공사(2차) 착공('23.11.27.) ○ 2023년 어린이보호구역 바닥신호등 설치공사(2차) 준공('23.12.18.) ○ 관계기관 의견 조회 및 현장조사('24.1.) ○ 2024년 어린이보호구역 바닥신호등 설치공사 착공('24.3.13.) ○ 2024년 어린이보호구역 바닥신호등 설치공사 준공('24.4.13.)
이번 분기 추진 실적	○ 2025년 바닥신호등 설치 장소 현장조사('24.09.~12.)

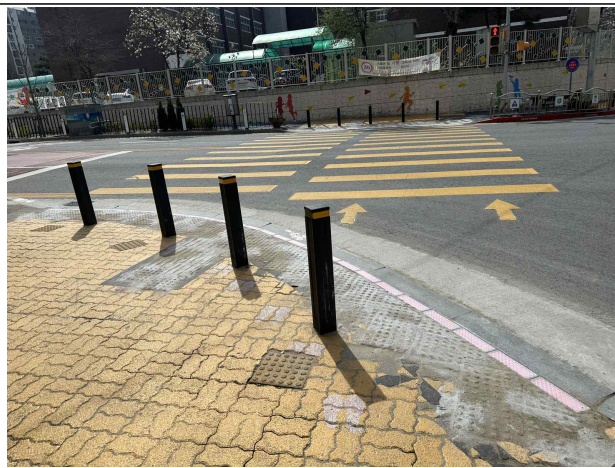

2024년 어린이보호구역(회덕초외 3개소) 바닥신호등 설치공사

☐ 문제점 및 대책

- 해당없음

☐ 향후 계획

- 2024.하반기 ~ 2026. 상반기 : 바닥신호등 설치 공사 추진

사 업 구 분					총사업비 (백만원)	이 행 도						이행율 (%)
완료시기	사업기간	사업주체 (국가/市/자체)	신규 여부	국책 사업		완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기	
임기내	23~26년	자체	신규	×	4,000			○				20
중앙정부 도움 필요성					해당 없음 (√) / 도움 필요 제도() 재정() 권한()							

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비 고
공영주차장 조성	개소	목표	1	-	-	1	-	정상추진
		실적	-	-	-	-	-	

□ 추진실적

그간 추진 실적	○ 타당성 조사용역 착수('23.02.24.) ○ 관련기관 업무협의/국가철도공단('23.05.19.~07.27.) ○ 2024년 주차환경개선지원사업 신청서 제출('23.07.27.) / 미선정 ○ 타당성 조사용역 준공('23.10.20.) ○ 區 투자심사 결과 통보(원안의결)('23.11.06.) ○ 도시관리계획 결정 및 실시설계용역 착수('24.03.05.) ○ 도시관리계획 결정 및 실시설계용역 선금(80백만원) 집행('24.03.28.) ○ 도시관리계획 결정(변경) 입안 요청('24.05.10.) / 교통과→도시계획과 ○ 2025년 주차환경개선지원사업 신청서 제출('24.06.26.) / 區→市 ○ 도시관리계획 결정(변경) 입안에 대한 관계기관 의견 회신('24.08.02.) ⇒ 국가철도공단: 개발계획 검토중으로 '24. 12. 이후 매각 검토 가능
이번 분기 추진 실적	○ 제11회 시구정책조정간담회 사업비 지원 건의('24.11.) ⇒ 市: 2025년 추경 또는 2026년 본예산 반영 적극 노력 ○ '24. 12. : 국유재산 활용계획 의견 회신 ⇒ 국가철도공단: '25. 5.까지 개발계획 검토중인 부지임

6. 충청권 광역철도 인근 공영주차장 조성 사업비 지원(계속) □ 사업개요 ○ (위 치) 내덕구 중리동 365-5번지 일원 ○ (기 권) 2024. 1. ~ 2026. 12. ○ (내 용) 공영주차장 조성(4,500㎡) / 주차면수 132면 ○ (사업비) 40억원(시50, 구50) □ 추진사항 ○ (2023. 6.) 일부 원의 표정(1, 2차) / 區 → 국가철도공단 ○ (2023. 7.) 일부원래에 대한 회신(2차) / 국가철도공단 → 區 ○ (2023. 7.) 2024년 주차환경개선지원사업 신청 / 區 → 市(미반영) ○ (2023. 10.) 타당성 조사용역 준공(2023. 2. 착수) ○ (2024. 3.) 도시관리계획(주차장) 결정 및 실시설계용역 착수 ○ (2024. 6.) 2025년 주차환경개선지원사업 신청 / 區 → 市(미반영) ○ (2024. 8.) 도시관리계획 결정(변경) 입안 회신 폐쇄에 따른 용역입사지 ○ 국가철도공단: 개발계획 검토 중으로 2024. 12. 이후 매각 검토 가능 □ 본 재 정 ○ 당해연 재정여건 상 구 재정만으로 충당하기 어려운 상황 □ 건의사항 ○ 도시철도 2호선 및 충청권 광역철도 조성에 따른 주차 수요 충족을 위한 시설, 합당한 사업 진행을 위해 시비(30%) 지원 건의사항 검토결과 ▶ 2025년 추경 또는 2026년 본예산 반영 적극 노력		
시구정책간담회 내용		

□ 문제점 및 대책

- 2025년 주차환경개선지원사업 미선정에 따른 사업비 미확보
- ⇒ 2026년 주차환경개선지원사업 신청(2025.6.) 후, 결과 반영 예정

□ 향후 계획

- '25. 06. ~ '25. 12. : 행정절차(도시계획시설결정, 보상협의 등) 추진
- '26. 01. ~ '26. 12. : 공사 추진


관리번호	신 탄 진 역 서 측 주 차 환 경 개 선										
1-5											
주관부서	교통과			주차시설팀장 김관수 ☎ 608-5291				담당자 장호용 ☎ 608-5292			
사 업 구 분											
완료시기	사업기간	사업주체 (국가/市/자체)	신규 여부	국책 사업	총사업비 (백만원)	이 행 도					이행율 (%)
					완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기	
임기내	23~25년	자체	신규	×	2,022			○			20
중앙정부 도움 필요성					해당 없음 () / 도움 필요 제도() 재정(√) 권한()						

☐ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비 고
공영주차장 조성	개소	목표	1	-	-	1	-	정상추진
		실적	-	-	-	-	-	

☐ 추진실적

그간 추진 실적	○ 타당성 조사용역 착수('23.02.24.) ○ 타당성 조사용역 중간보고회 개최('23.09.12.) ○ 타당성 조사용역 준공('23.10.20.) ○ 신탄진 재정비촉진계획(변경) 용역 관련 의견 조회('24.04.11.)/도시계획과→교통과 ○ 신탄진 재정비촉진계획(변경) 용역 관련 의견 화신('24.04.19.)/교통과→도시계획과 ※ (의견내용) 도시계획시설(주차장) 결정(변경) 반영 ○ 신탄진 재정비촉진계획(변경) 용역 일시정지('24.8.16.) ※ 공청회 의견 반영을 위한 주민간담회 개최 필요, 재정비 촉진계획(변경) 신청, 관계기관(부서) 협의 및 대전광역시 도시재정비위원회 심의 등 필요
이번 분기 추진 실적	○ 신탄진 재정비촉진계획 결정(변경) 관계기관 협의의견 조치계획 제출('24.12.10.)/도시계획과→市 도시정비과

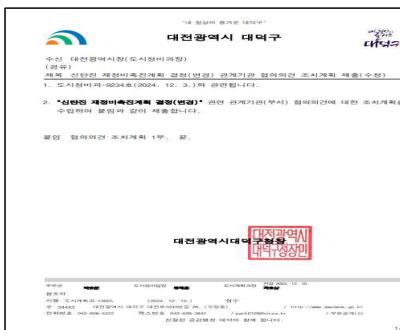

☐ 문제점 및 대책

- 2025년 02월 도시계획시설(주차장) 결정이 완료된 후, 타당성 조사결과 2,022백만원이라는 사업비가 수반되어 구 자체 예산으로는 사업추진이 어려운 실정으로,
- 대전시에 '주차환경 개선사업' 및 '재정비 촉진지구 기반시설 설치비' 신청 등 예산을 확보하기 위해 여러 가지 방안 강구

☐ 향후 계획

- '25. 01. ~ '25. 12. : 공모사업 및 시비 지원 신청 등 예산 확보 방안 강구
- '26. 01. ~ '26. 12. : 공사 추진

[illegible]

☐ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비 고
상행선 개통	개소	목표	1	-	-	-	1	정상추진
		실적	-	-	-	-	-	
하행선 개통	개소	목표	1	-	-	-	1	정상추진
		실적	-	-	-	-	-	

☐ 추진실적

그간 추진 실적	○ 신탄진휴게소에 고속버스 정차 건의 / 대덕구→고속버스조합('22.8.) ○ 신탄진휴게소 고속버스정류소 설치 타당성 조사용역 실시('23.6.) ○ 타당성 조사용역 최종완료 보고('23.12.) ○ 금남고속 방문('24.1.) 및 업무협의 면담(구청장↔금남고속 대표) 2회 ○ 국토부 질의회신 결과 통보(→운수업체,충청남도)('24.4.~5.) ○ 주민추진위원회(13인) 구성 및 구청장↔추진위 간담회 개최('24.5.~6.)
이번 분기 추진 실적	○ 버스정류소 설치 재검토 방침(정류소 설치장소 변경 등)('24.7.) ○ 구청/주민추진위원회/금남·중부고속 간 설치 장소 업무협의('24.7.) ○ 경제환경국장 외 2인 금남·중부고속 공동대표 업무협의('24.8.) ○ 신탄진역 인천공항버스운행 정류소 설치 보도자료 배포('24.9.) ○ 대전광역시 업무협의 면담(경제환경국장↔市 운송주차과장)('24.9.) ○ 충남도청 방문 노선관련 협의(대덕구청 ↔ 충남도청)('24.12.) ○ 신탄진 인천공항버스운행 시외버스 노선 신설 협조 요청 공문 발송 (대덕구청 → 충남도청)('24.12.)



주민추진위원회 간담회



신탄진휴게소 고속·시외버스 정류소 설치에 대한 자료문도 500



버스정류소 설치 재검토 방침



구청/주민추진위원회/금남·중부고속 협의

☐ 문제점 및 대책

- 시외버스 운수업체 재정지원 법적근거 미비

☞ '25 재정지원 조례 근거 마련으로 손실 발생 시 사후정산

☐ 향후 계획

- 우리 구 조례 제정 / ~25년 1월
- 운수업체와 업무협약 및 개통 / ~25년 상반기 限

☐ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비 고
재 정 확 보	백만원	목표	18,600	-	-	6,200	6,200	*국비확정 통지(24.10.)
		실적	25,600	-	-	25,600	-	
공사 공정률	%	목표	60	-	-	20	40	정상추진
		실적	20	-	-	20	-	

☐ 추진실적

그간 추진 실적	○ '22.10. : 장동탄약창 방문(부대 관통도로 개방 건의) / 市·區→탄약창 - 회신의견 : 부대 및 시설 이전할 경우 도로 개방 가능 / 현실적 불가 ○ '23. 2. : 문제점 시장·구청장보고 / 도로 신설로 市·區간 협의 당부 ○ '23. 4. : 주한미군 공여구역주변지역 등 발전종합계획 변경(안) 제출 ○ '23. 12. : 주한미군 공여구역 주민지원사업 국비지원 확정 ○ '24. 2. : 지방재정영향평가 실시 ○ '24. 3. : 「장동~이현 간 도로개설 사업」 추진계획 방침 완료 ○ '24. 4~ 6. : 중앙투자심사 실시 / 결과: 조건부 승인 ※ 승인조건: 주한미군 발전종합계획 반영 확정 후 사업추진 ○ '24. 6. ~ 9. : 주한미군 공여구역 주변지역 발전종합계획 반영 추진 ○ '24. 9. : 지역정계 방문 발전종합계획 조속 반영 지원 요청
이번 분기 추진 실적	○ '24. 10. : 주한미군 발전종합계획 반영 완료 / 사업비 248억 확보 ○ '24. 11. : 기본 및 실시설계용역 1차분 발주 추진 / 구비 2억원 ○ '24. 12. : 2024년도분 국·시비 교부 / 국비 4억·시비 2억

☐ 문제점 및 대책

- 해당없음

☐ 향후 계획

- '25. 1. ~ '25. 12. : 기본 및 실시설계 용역 추진
- '26. 1. ~ '27. 12. : 보상 및 공사 추진

관리번호 1-8	읍내동 효자지구 주거환경개선사업 적극 지원
-------------	-------------------------

주관부서	도시계획과	도시정비팀장 류제훈 ☎ 608-5371	담당자 박호준 ☎ 608-5372
------	-------	-----------------------	--------------------

사 업 구 분					총사업비 (백만원)	이 행 도						이행율 (%)
완료시기	사업기간	사업주체 (국가/市/자체)	신규 여부	국책 사업		완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기	
임기후	22~27년	LH	×	×	비예산		○					60
중앙정부 도움 필요성					해당 없음 (√) / 도움 필요 제도() 재정() 권한()							

☐ 사업현황 및 정책목표

- 정비기반시설이 열악하고, 노후·불량건축물이 밀집한 읍내동 지역의 주거 환경 개선을 통한 도시환경 개선

☐ 사업개요

- 위 치 : 읍내동 240번지 일원
- 면 적 : A=101,264.1㎡(1단계 66,389.3㎡, 2단계 34,874.8㎡)
- 내 용 : 공동주택(1,620세대) 건설 및 기반시설 설치
- 기 간 : 2007. ~ 2027.

☐ 연차별 로드맵

구 분		2022		2023				2024				2025				2026		임기후	
단위사업	세부추진	1	2	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	26년 하반기	27년 이후
효자구역(1단계) 주거환경 개선사업	사업시행인가고시 및 보상추진																		
	공사 추진																		

☐ 연도별 투자계획 : 비예산

☐ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비 고
행정절차 진행률	%	목표 100% (공정률80%)	20% (물건조사)	40% (보상)	60% (철거 이주)	80% (착공)	100% (공사완료)	정상추진
		실적 50%	20%	30%	60%	-	-	

□ 추진실적

그간 추진 실적	○ '22.8.26. : 사업시행계획인가 고시 ○ '22.10. ~ '23.3. : 제1~3차 주민설명회 개최 ○ '22.11. ~ '23.2. : 지장물 조사 ○ '23.12.29. : 경영투자심사(LH) 통과 및 보상계획공고 실시 ○ '24.2.27. : 제1차 보상협의회 개최 / '24.6.4. : 제2차 보상협의회 개최 ○ '24.4. ~ 6. : 감정평가 완료 ○ '24.7.10. : 정비계획 결정(변경) 및 정비구역 지정(변경) 고시(市) ○ '24.7.26. : 보상 개시(LH) / 24.12.31.기준 보상률 62% ○ '24.8.30. : 사업시행계획(변경) 인가 신청(LH→區)
이번 분기 추진 실적	○ '24.9.10. ~ 10.4. : 사업시행계획(변경) 인가 관계기관(부서) 협의 ○ '24.9.23. ~ 10.7. : 사업시행계획(변경) 인가 주민 의견청취 공고 ○ '24.11.14. : 사업인정(의제) 경미한 변경 추가협의(區→중토위) ○ '24.12.06. : 사업인정(의제) 심의결과 회신(중토위→區) ○ '24.12.11. : 사업시행계획(변경) 인가(區)

“내 일상이 즐거운 대덕구”

대전광역시 대덕구

수신 중앙토지수용위원회
(결정)

사업인정(의제)사업 결의한 변경에 따른 추가협의 요청(읍내동1(표자구역) 주거환경개선사업)

1. 위 위원회의 무효한 결정을 기함합니다.

2. 한국토지주택공사 등이 시행하는 아래 공익사업에 관하여 공익성 협회가 기 한로 의정(노(22의제1406), 사업계획의 결의한 변경으로 수용(사용)할 토지 등이 추가로 편입되어 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제41조에 따라 위 위원회의 의견을 듣고자 추가 협의를 요청하오니 회신하여 주시기 바랍니다.

□ 사업개요

가. 사. 업. 명 : 읍내동1(표자구역) 주거환경개선사업

나. 사업시행자 : 한국토지주택공사, 계룡건설산업(주), 현대건설, 현대건설

다. 시행예정지 : 대전광역시 대덕구 읍내동 240번지 일원

라. 근거 법률 : 도시 및 주거환경정비법 제63조(토지 등의 수용 또는 사용)

3. 아울러, 본 사업의 공익성의 변동이 클리하고 판단되므로 간소화된 추가협의 요청서 및 관련서류를 제공정보시스템(LTIS)에 입력 및 첨부하길요를 알려드립니다. 끝.

대전광역시대덕구청장

주무관: 박종환 (042-838-1111) / 1111 / 1111 / 1111
담당자: 김민준 (042-838-1111) / 1111 / 1111 / 1111
전화번호: 042-838-1111 / 042-838-1111 / 042-838-1111 / 042-838-1111
주소: 대전광역시 대덕구 대덕로135길 20 (오정동) / 042-838-1111 / 042-838-1111 / 042-838-1111
홈페이지: 대전광역시 대덕구 홈페이지 (www.daejeon.go.kr)

중앙토지수용위원회
협 의 의 결 서

사건번호	24의제204	사업명	읍내동1(표자구역) 주거환경개선
입허가기관	대전광역시 대덕구청	사업시행자	한국토지주택공사, 계룡건설산업(주), 현대건설, 현대건설
인가명	도시정비법	사업기간	2022. 06. 26. ~ 2029. 12. 31.
사업유형	주거환경개선사업	위치	대전광역시 대덕구 읍내동
위원회 의결	2024. 12. 05.	면적	66514㎡

위 사업에 관하여 우리 위원회는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제21조 제2항에 따라 아래와 같이 협의 의견을 제시한다.

협의의견	조언부 동의
내 용	「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제21조 제2항에 따라 아래와 같이 협의 의견을 제시한다.
○ 본 협의요청은 중토위 협의의견이 기 제시된 바 있으므로(22의제1406, '23.8.11.) 해당 조건을 이행하고 수용계획 신청하는 것을 조건으로 동의함	

중앙토지수용위원회위원장

위원장: 최국자 (042-838-1111) / 1111 / 1111 / 1111
담당자: 김민준 (042-838-1111) / 1111 / 1111 / 1111
전화번호: 042-838-1111 / 042-838-1111 / 042-838-1111 / 042-838-1111
주소: 대전광역시 대덕구 대덕로135길 20 (오정동) / 042-838-1111 / 042-838-1111 / 042-838-1111
홈페이지: 대전광역시 대덕구 홈페이지 (www.daejeon.go.kr)

대전광역시 대덕구 고시 제2024-134호

읍내동1(표자구역) 주거환경개선사업 사업시행계획(변경) 인가 고시

대전광역시 대덕구 읍내동 240번지 일원의 「읍내동1(표자구역) 주거환경개선사업」에 대하여 「도시 및 주거환경정비법」 제50조제1항의 규정에 따라 사업시행계획(변경) 인가하고, 같은 법 제50조제9항 및 같은 법 시행규칙 제10조제3항의 규정에 따라 아래와 같이 고시합니다. 이에 같은 법 제57조의 규정에 따라 의제되는 사항과 같은 법 제65조의 규정에 따라 준용되는 사항은 본 고시로써 관계법률에 따른 인·허가 등의 고시·공고가 있는 것으로 봅니다.

2024. 12월 11일

대전광역시 대덕구청장

사업인정(의제) 변경 협의

사업인정(의제) 심의결과 회신

사업시행계획(변경) 인가 고시문

□ 문제점 및 대책

- 사업시행인가조건 부여에 따른 2단계 구역 기반시설설치 협의(區↔LH)
 - 2단계 구역 사업성 분석 및 사업계획(규모, 지자체분담금 등) 다각적 검토

□ 향후 계획

- '25. : 수용재결 신청, 실시설계 및 지장물 철거(LH)
- '26. ~ : 공사 추진(LH)

관리번호 1-9		대 화 동 일 원 재 개 발 사 업 적 극 지 원										
주관부서		공동주택과		재개발팀장 박장규 ☎ 608-4181		담당자 양장선 ☎ 608-4182		담당자 송준용 ☎ 608-4183				
사 업 구 분					총사업비 (백만원)	이 행 도						이행율 (%)
완료시기	사업기간	사업주체 (국가/시/자체)	신규 여부	국책 사업		완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기	
임기 내	22 ~ 26년	민간	가추진	×	해당없음		○					60
중앙정부 도움 필요성					해당 없음 (√) / 도움 필요 제도() 재정() 권한()							

☐ 사업현황 및 정책목표

- 노후·불량 주택 지역의 기반시설 정비 및 주거환경 개선 으로 주민 삶의 질 향상
- 관내 재개발 정비사업을 통한 주거여건 개선 및 주택공급 활성화

☐ 사업개요

- 재개발 추진 구역(대화동1·2·4구역)은 사업추진이 원활하도록 적극 행정 지원
- 재개발 정비사업 예정지(대화동3구역)에 대하여 정비구역 지정 추진

☐ 연차별 로드맵

구 분		2022		2023				2024				2025				2026		임기후	
단위사업	세부추진	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	26년 하반기	27년 이후
대화동1구역 재개발사업	사업시행인가	■																	
	관리처분인가		■	■	■	■	■	■	■	■	■								
	이주 및 철거									■	■	■	■	■	■	■	■		
	공사착공																	■	■
대화동2구역 재개발사업	시공사 선정	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	정비기본계획 변경												■	■	■	■	■		
	정비계획 및 구역지정 변경																	■	■
대화동4구역 재개발사업	정비구역 지정	■	■	■	■														
	추진위원회 승인			■	■	■	■	■	■	■	■								
	조합설립인가							■	■	■	■								
	시공사 선정 및 통합심의 완료									■	■	■	■	■	■	■	■		

☐ 연도별 투자계획 : 비예산(사업시행자 부담)

☐ 공약달성 확인지표

- 대화동1구역 재개발정비사업

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비 고
행정절차 진 행 률	%	목표	100%	30%	60%	60%	100%	정상추진
		철거완료 (80%)	사업시행 인가	관리처분 인가	이주 및 철거	이주 및 철거	이주 및 철거완료	
		실적	40%	30%	60%	-	-	

○ 대화동2구역 재개발정비사업

확인지표	단위	목표·실적		2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비 고
행정절차 진행률	%	목표	100% 계획변경 (100%)	0% 시공사 선정	0% 시공사 선정	0% 시공사 선정	50% 시공사 선정	100% 정비기본 계획변경	정상추진
		실적	0%	0%	0%	0%	-	-	

○ 대화동4구역 재개발정비사업

확인지표	단위	목표·실적		2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비 고
행정절차 진행률	%	목표	100% 시공사 선정완료	20% 정비구역 지정	40% 추진위 승인	60% 조합설립 인가	60% 시공사선정 및 통합심의완료	100% 시공사선정 및 통합심의완료	정상추진
		실적	50%	20%	40%	60%	-	-	

□ 추진실적

그간 추진 실적	○ 2023. 01. : 대화동2구역 사업방식 변경(뉴스테이→일반분양) 조합총회 ○ 2024. 03. : 대화동4구역 조합설립추진위원회 구성 및 승인 ○ 2024. 04. : 대화동1구역 관리처분계획인가 고시 ○ 2024. 07. : 대화동3구역 의회의견 청취 ○ 2024. 07. : 대화동4구역 조합설립 인가 ○ 2024. 08. : 대화동1구역 수용재결 열람공고
이번 분기 추진 실적	○ 2024. 10. : 대화동4구역 회계감사 완료 ○ 2024. 11. : 대화동1구역 재결서 정본 공시송달 공고 ○ 2024. 12. : 대화동2구역 규정위반 행정지도 실시

 수신 대화동4구역 재개발정비사업조합 조합장 김명호 (경유) 제목 대화동4구역 재개발정비사업조합 외부 회계감사 결과 알람 1. 귀 조합의 무공한 발전을 기원합니다. 2. 「도시 및 주거환경정비법」 제112조에 따라 외부 회계감사를 실시하고, 그 결과가 청정하면 따라 감사결과를 15일 이내에 조합원이 공람할 수 있도록 해주시기 바랍니다. 붙임 감사보고서 1부, 끝.	대덕구 공고 제2024 - 1198호 재결서 정본 공시송달공고 대화동1구역 재개발정비사업조합이 시행하는 「대화동1구역 재개발정비사업」과 관련하여 대전광역시 토지수용위원회에서 2024. 8. 27. 자로 재결된 토지 등에 대한 재결서 정본을 소유자에게 송달하고자 하였으나, 폐문부제 등의 사유로 송달할 수 없는 바, 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 시행령 제4조의 규정에 따라 아래와 같이 공시송달 공고를 하고자 합니다. 2024. 11. 29. 대전광역시 대덕구청장	수신 대화동2구역 주택재개발정비사업조합 (경유) 제목 「대화동2구역 주택재개발정비사업 조합장권, 규정위반 행정지도(2회)」 1. 귀 조합의 무공한 발전을 기원하되, 공동주택법 제207조(2024. 10. 14.)와 관련됩니다. 2. 「대화동2구역 주택재개발정비사업 조합장권, 제20조제3항에 「불기총회는 1년, 회계년도 종료일부터 9월 이내에 개최한다.」라고 규정되어 있음에도 불구하고 2024년도 정기총회를 개최하지 개최하지 않았습니다. 3. 이에 정관규정 위반(불기총회 미개최)에 대하여 재차 행정지도 하오니, 정관규정에 따른 주택재개발정비사업이 추진될 수 있도록 정기총회를 개최하여 주시기 바랍니다. 대화동2구역 주택재개발정비사업 조합장권 제20조(총회의 설치) ① 불기총회는 매년 1회, 회계년도 종료일부터 3월 이내에 개최한다. 다만, 부득이한 사정이 있는 경우에는 6월 범위 내에서 사유와 기간을 명시하여 일시를 변경할 수 있다. 다만, 당해년도 조합운영에 예견된 전년도와 동일하며, 예견 외에 특별한 안전이 없는 경우에는 대의회의 의결로 정기총회를 개최하지 않을 수 있으며, 이 경우에는 조합원들에게 그러한 사유를 개별 통지하여야 한다. 붙임 규정위반 행정지도(1회) 관련공문 1부, 끝.
대화동4구역 회계감사 완료	대화동1구역 재결서 정본 공시송달공고	대화동2구역 규정위반 행정지도

□ 문제점 및 대책

- 대화동2구역 재개발사업 사업방식 변경(뉴스테이→일반분양) 결정 후 시공사 선정 유찰에 따른 공약사업 계획 수정 필요
- 시공사 선정 완료 후 행정절차(뉴스테이 사업 취소 및 기본정비계획 변경) 신속 추진

□ 향후 계획

- 2025. 상반기. : 대화동2구역 시공사 선정을 위한 조합총회 개최
- 2025. 상반기. : 대화동3구역 정비구역 지정 완료
- 2026. 상반기. : 대화동1구역 이주 및 철거 완료
- 2026. 상반기. : 대화동4구역 시공사 선정 및 통합심의 완료

관리번호 1-10	주택 재건축 정비사업 추진(법동,회덕동,대화동)
--------------	----------------------------

주관부서	공동주택과	공동주택팀장 정일권 ☎ 608-5171	담당자 황건하 ☎ 608-5172
------	-------	-----------------------	--------------------

사 업 구 분					총사업비 (백만원)	이 행 도						이행율 (%)
완료시기	사업기간	사업주체 (국가/市/자체)	신규 여부	국책 사업		완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기	
임기 내	22~26년	자체	신규	×	1,716			○				55
중앙정부 도움 필요성					해당 없음 (√) / 도움 필요 제도() 재정() 권한()							

☐ 사업현황 및 정책목표

- 노후·불량 주택 지역의 기반시설 정비 및 주거환경 개선으로 주민 삶의 질 향상
- 관내 재건축 정비사업을 통한 주거여건 개선 및 주택공급 활성화

☐ 사업개요

- 재건축 진행 단지(와동2구역, 법동2구역)는 사업추진이 원활하도록 적극 행정 지원
- 정비예정구역 4개 단지에 대하여 안전진단 용역 및 정비계획 수립 추진

☐ 연차별 로드맵

구분		2022		2023				2024				2025				2026		임기후	
단위사업	세부추진	1	2	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	26년 하반기	27년 이후
주택 재건축	안전진단 용역 추진																		
	정비계획 예산 수립																		
주택 재건축	정비구역 지정 및 정비계획 용역 추진																		

☐ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (총사업비)	임기내						임기후	확보액	집행액
		소계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.			
계	1,716	1,716	455	1,261	0	0	0	0	1,716	915
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시비	1,373	1,373	364	1,009	0	0	0	0	1,373	732
구비	343	343	91	252	0	0	0	0	343	183
기타(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

☐ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적		2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비고
주택 재건축	%	목표	100 재건축 시행	10% 안전진단 예산확보	30% 안전진단 예산확보	50% 정비계획 용역착수	70% 정비구역 지정	100% 재건축시행 (추진위승인)	정상 추진
		실적	50%	10%	30%	55%	-	-	

☐ 추진실적

그간
추진
실적

- 2022. 12. 15. : 재건축 안전진단 용역 추진계획 수립
- 2023. 01. ~ 06. : 안전진단 용역 발주 및 실시
- 2023. 05. 26. : 신대주공, 연축주공 정밀안전진단 용역완료(D등급/ 조건부재건축)
- 2023. 06. 23. : 중리주공2, 소라 정밀안전진단 용역완료(D등급/ 조건부재건축)
- 2023. 07. 06. : 재건축정비사업 추진계획 수립
- 2024. 01. 12. : 도시· 주거환경정비기금 보조금 확보
- 2024. 03. : 4개단지 일상감사 및 계약심사 완료
- 2024. 04. 03. : 용역 사업수행능력평가 세부계획수립
- 2024. 04. 11. : 4개단지 정비계획수립용역 계약의뢰(→ 총무과)
- 2024. 06. 17. : 대화동소라 정비계획수립용역 착수
- 2024. 07. 18. : 대화동소라 정비계획수립용역 착수보고회
- 2024. 07. : 연축주공· 신대주공· 중리주공2 정비계획수립용역 착수
- 2024. 07. 31. : 중리주공2 정비계획수립용역 착수보고회
- 2024. 08. 29. : 연축주공 정비계획수립용역 착수보고회
- 2024. 09. 05. : 신대주공 정비계획수립용역 착수보고회

이벤
분기
추진
실적

- 2024. 09. ~ 12. : 4개단지 정비계획수립용역 추진
- 정비구역 지정 입안제안도서 작성 및 주민동의서 징구

대전광역시 대덕구

수신 연축주공아파트 토지통소유자 귀하
(경우)
제목 정비구역 지정 및 정비계획 수립을요에 대한 주민동의 수렴(연축주공아파트)
1. 가 항의 무효한 발언을 기원합니다.
2. 우리 구에서는 연축주공아파트(연축동 102번지 일원)를 대상으로 「연축주공 정비구역 지정 및 정비계획수립 용역」을 실시하고 있어, 정비사업에 대한 최향 공급정책, 복귀 시설 등 주민의견을 수렴하여 효율적인 계획을 수립하고자 하오니,
3. 참보 구역 내 토지통소유자를 대상으로 설문조사를 2024. 11. 15.(금)까지 실시하고자 하였으나 적극 협조하여 주시기 바라며, 기타 공정한 사항이 있으신 경우 대덕구청 공동주택과 ☎2042-0008~5172로 문의하여 주시기 바랍니다.
붙임 설문조사서 1부(발령). 끝.

대전광역시 대덕구 행정국장 김민준

사무장 송인환 / 담당자 송인환 / 연락처 204-0008 / 이메일 sounghwan@daedegu.go.kr
사무장 송인환 / 담당자 송인환 / 연락처 204-0008 / 이메일 sounghwan@daedegu.go.kr
사무장 송인환 / 담당자 송인환 / 연락처 204-0008 / 이메일 sounghwan@daedegu.go.kr

이름	(면적/평)	동 · 호 수	등 호
주소(실거주지)			
전화번호		작성일 2024. . .	

- 귀하께서는 현재 연축주공아파트의 주택 소유 현황은 어떻게 되십니까?
① 자가(말대인, 집주인) ② 세입자(전세, 월세)
- 귀하께서는 현재 연축주공아파트가 재건축이 필요하다고 생각하시니까?
③ 재건축이 필요하다 ④ 재건축이 필요하지 않다
- 재건축이 필요한 이유는 무엇이라고 생각하시니까?
⑤ 집이 낡아서 ⑥ 기반시설이 부족해서
⑦ 재산증식을 위해서 ⑧ 기타()
- 재건축이 필요하지 않은 이유는 무엇이라고 생각하시니까?
⑨ 경제적 사정 ⑩ 현재 상태에 만족
⑪ 임대수익 ⑫ 기타()
- 연축주공아파트의 소유하고 계신 주택의 면적(평)을 선택해 주시길 바랍니다.
⑬ 45㎡(14방) ⑭ 52㎡(16방)

신대주공구역 재건축사업
기본계획(변경)·정비계획 결정 및
정비구역 지정 입안제안도서

2024. 12.

신대주공구역 재건축사업 준비위원회

재건축 주민의견 수렴(공문)

주민 설문조사서

입안제안도서

□ 향후계획

- 2025. 상반기 : 4개단지 市 도시계획위원회 심의

관리번호 1-11	법동소류지 통과박스 확장 적극 지원											
주관부서	건설과		도로팀장 문병진		☎ 608-5211		담당자 정성희		☎ 608-5212			
사업구분					총사업비 (백만원)	이행도						이행율 (%)
완료시기	사업기간	사업주체 (국가/시/자체)	신규 여부	국책 사업		완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기	
임기내	22~25년	한국도로 공사	신규	×	8,000			○				82
중앙정부 도움 필요성					해당 없음 (√) / 도움 필요 제도() 재정() 권한()							

- ☐
사업현황 및 정책목표
- 법동소류지 통과박스 확장을 통해 통행편의 제공 및 정주여건 개선
- ☐
사업개요
- 사업기간 : 2022 ~ 2025
- 사업내용 : 기존 통과박스(경부고속국도) 확장(B=5.0m→B=12.0m) L=43m
- 시행자 : 한국도로공사

☐
연차별 로드맵

구분		2022		2023				2024				2025				2026		임기후	
단위사업	세부추진	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	26년 하반기	27년 이후
법동 소류지 통과박스 확장	관련기관 방문																		
	지역구 국회의원 방문																		
	사업시행자 행정지원																		

☐
연도별 투자계획

(단위 : 백만원)



구분	합계 (총사업비)	임기내						임기후	확보액	집행액
		소계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.			
계	8,000	8,000	0	500	3,200	4,300	0	0	300	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시비	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0
구비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타(민자)	8,000	8,000	0	500	3,200	4,300	0	0	0	0

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비 고
국회의원 방문	회	목표	3	1	1	-	-	완료
		실적	3	1	1	-	-	
관련기관 협의	회	목표	2	1	-	-	-	완료
		실적	2	1	-	-	-	
사업시행자 행정 지원	회	목표	6	-	2	2	-	이행후 지속추진
		실적	4	-	2	-	-	

□ 추진실적

그간 추진 실적	○ '22. 10. ~ 12.: 통과박스 확장 동의 연명부 서명 운동 ○ '22. 12. ~ '23. 3.: 국회의원 방문(3회), 한국도로공사 의견 전달 및 회신 ○ '23. 03. 29.: 한국도로공사(본사) 방문 집회 및 건의문 전달 ○ '23. 04. 19.: 고충민원 접수(주민대표→국민권익위원회) ○ '23. 05. ~ 09.: 고충민원 조사 관련 관계기관 협의(권익위·대덕구·한국도로공사) ○ '23. 9. 27.: 고충민원 처리결과 통보(국민권익위원회→주민대표, 대덕구) ▶ 한국도로공사가 동의하지 않는 통로 확장 비용에 대한 권익위 관여 부적절 ○ '23. 11. 01.: 2023년 대전시장 「자치구 방문」 현장방문 건의 ○ '24. 03. ~ 04.: 시비보조금 요청(區→市) 및 알림(區→市) / 용역비 3억 원 ○ '24. 05. 16.: 통과박스 확장 관련 협의 / 한국도로공사 본사 및 대전지사 ○ '24. 07. 09. : 한국도로공사 부사장 면담 보고 / 市 건설도로과 ○ '24. 09. 25. : 사업비 지원 건의 / 區→市 의회
이번 분기 추진 실적	○ '24. 10. 08. : 지역구 국회의원(박정현) 사무실 방문 및 협조 요청 ○ '24. 11. 07. : 한국도로공사(본사)방문 면담 ○ '24. 12. 02. : 통로암거 확장 관련 협의 요청 및 완료

 지역구 국회의원 사무실 방문	 한국도로공사(본사)방문 면담	 통로암거 확장 관련 협의 요청
--	---	---

□ 문제점 및 대책

- 사업비(미 확보 예산 / 5,500백만원) 확보 및 지원

□ 향후 계획

- 위·수탁 협약(區·한국도로공사) 및 설계비 지급(區→한국도로공사)
- 사업비 지원 추진 / 區·市

관리번호 1-12		도시재생 신규 발굴 사업화										
주관부서		도시계획과		재생사업팀장 웅상열 ☎ 608-5951				담당자 김진태 ☎ 608-5952				
사업구분					총사업비 (백만원)	이행도						이행율 (%)
완료시기	사업기간	사업주체 (국가/시/자체)	신규 여부	국책 사업		완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기	
임기후	23~27년	자체	신규	×	20,000			○				50
중앙정부 도움 필요성					해당 없음 () / 도움 필요 제도() 재정(√) 권한() √ 표시							

☐ 정책목표

- 지역의 고유자산 등을 활용한 지역 특화 재생사업 발굴로 쇠퇴한 도시 회복력 향상 및 지역경제 발전 도모

☐ 사업개요

- 추진방향 : 국토교통부 도시재생사업 신규 공모* 신청 및 선정
 - * 특화재생 유형(시·도 선정), 매년 하반기 공모 신청(변동 가능)
- 사업기간 : 2023. ~ 2027.
- 사업내용 : 지역의 특성 및 상징성을 향상시킬 수 있는 특화 사업 추진
 - 역사·문화 등 지역자원 활용 도시브랜드화 및 중심·골목상권 활성화, 창업 지원, 로컬컨텐츠타운 조성 등

☐ 연차별 로드맵

구 분		2022		2023				2024				2025				2026		임기후	
단위사업	세부추진	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	26년 하반기	27년 이후
도시재생 신규 발굴	사업지 발굴 및 계획(안) 수립																		
	공모신청 및 대응																		
	사업 추진																		

☐ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계 (총사업비)	임 기 내						임 기 후	확 보 액	집 행 액
		소계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.			
계	20,000	10,000	0	0	2,500	5,000	2,500	10,000	200	200
국 비	10,000	5,000	0	0	1,250	2,500	1,250	5,000	0	0
시 비	7,000	3,500	0	0	875	1,750	875	3,500	200	200
구 비	3,000	1,500	0	0	375	750	375	1,500	0	0
기타(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

☐ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적		2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비 고
활성화계획 수립 (공모선정)	건	목표	1	-	-	1	-	-	2025년도
		실적	1	-	-	1	-	-	사업비결정

☐ 추진실적

그간 추진 실적	○ '22. 4. : 활성화계획 수립 용역 발주 ○ '22. 8. : 지역특화재생형 활성화계획(안) 수립 ○ '22. 8.~'23. 6. : 국토부 사전컨설팅, 지역기업·대학과 지속 업무협의 ○ '23. 6. : 우리동네살리기 유형으로 변경 추진 ○ '23.12. : 실행계획(안) 수립, 전문가 자문, 행정협의회 개최 ○ '24. 2.~3. : 주민공청회, 대덕구의회 의견청취, 국토부 사전컨설팅 ○ '24. 4.~6. : 상반기 공모신청, 중앙평가 / 미선정
이번 분기 추진 실적	○ '24. 10. : 市, 하반기 오정 혁신지구 후보지 공모 신청 ○ '24. 11. : 현장실사 및 발표평가 ○ '24. 12. : 결과발표 / 선정



위 치 도



구 상 도

☐ 문제점 및 대책 : 해당없음

☐ 향후 계획

- '25. 하반기 : 市, 오정 국가시범지구 공모 신청
- '26. 01. ~ '26. 12. : 사업시행계획 수립 및 절차 이행 / 도시공사
- '27. 01. ~ '30. 12. : 공사 추진

관리번호 2-1	전통시장 및 골목상권 활성화
-------------	-----------------

주관부서	경제과	소상공인지원팀장 이무성 ☎ 608-4521	담당자 백미영 ☎ 608-4522
------	-----	-------------------------	--------------------

사 업 구 분					총사업비 (백만원)	이 행 도						이행율 (%)
완료시기	사업기간	사업주체 (국가/市/자체)	신규 여부	국책 사업		완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기	
임기내	22~26년	자체	가결	×	3,800		○					100
중앙정부 도움 필요성					해당 없음 () / 도움 필요 제도(√) 재정(√) 권한()							

☐ 사업현황 및 정책목표

- 시설현대화 사업 등을 통한 다시 찾고 싶은 쇼핑 환경 조성
- 상인역량 제고를 통한 전통시장 자생력 강화

☐ 사업개요

- (사업명) 전통시장 및 골목상권 활성화
- (사업기간) 2022 ~ 2026년
- (사업내용) 전통시장 및 상점가 노후시설 개선, 쇼핑인프라 정비

☐ 연차별 로드맵

구분		2022		2023				2024				2025				2026		임기후	
단위사업	세부추진	1	2	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	26년 하반기	27년 이후
전통시장 및 골목상권 활성화	공모사업 참여																		
	시설 유지관리																		
	공동세일즈 프로모션 발굴																		

☐ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (총사업비)	임기내						임기후	확보액	집행액
		소계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.			
계	3,800	3,800	1,100	725	825	700	450	0	8,570	2,817
국비	1,400	1,400	0	400	400	400	200	0	500	0
시비	1,250	1,250	800	125	125	100	100	0	3,840	1,811
구비	950	950	200	200	200	200	150	0	4,210	1006
기타(민자)	200	200	100	0	100	0	0	0	20	0

☐ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비 고
확인지표명	건	목표	5	1	1	1	1	이행 후 계속추진
		실적	7	-	4	3	-	

☐ 추진실적

그간 추진 실적	○ 전통시장 전기설비 안전진단 실시('23. 3.) ○ 목상동음식특화거리 경관조명 조성공사 준공('23. 3.) ○ 2024년 전통시장 주차환경개선사업 공모 선정('23. 4.) ○ 비래동골목형상점가 경관조명 설치공사 준공('23. 9.) ○ 추석맞이 전통시장 장보기 행사('23. 9.) ○ 전통시장 및 상점가 등 소비촉진 이벤트 지원사업 추진('23. 9. ~ 12) ○ 2023년 상권 활성화 지원 사업 공모 선정('23. 10.) ○ 2024년 전통시장 및 상점가 시설현대화사업 공모 선정('23. 10.) ○ 대전산업용재유통단지 조형물 설치 준공('23. 11.) ○ 비래동골목형상점가 보행환경개선사업 공사 준공('23. 12.) ○ 2024년 전통시장 및 상점가 활성화 지원사업 공모 선정('23. 12.) ○ 법동시장 고객지원센터 건립 공사 준공('24. 1.) ○ 동절기대비 전통시장 화재예방 안전점검 실시('24. 1.) ○ 설맞이 전통시장 장보기 행사('24. 2.) ○ 2025년 전통시장 주차환경개선사업 공모 선정('24. 4.) ○ 중리·법동시장 폭염저감시설(증발냉방장치) 준공('24. 6.) ○ 2024년 대한민국 안전대전환 집중안전점검 실시('24. 5. ~ 6.) ○ 중리시장 안내 간판 및 조형물 교체 설치('24. 9.) ○ 2025년 전통시장 시설현대화사업 공모 선정('24. 9.) ○ 추석맞이 전통시장 장보기 행사('24. 9.)
이번 분기 추진 실적	○ 2024 전통시장 및 상점가 소비촉진이벤트사업 및 공동마케팅사업 추진('24. 9.~11.) ○ 2025년 전통시장 및 상점가 활성화지원사업 선정('24. 12.)



소비촉진이벤트사업(중리시장)



소비촉진이벤트사업(송촌동 상점가)



공동마케팅사업(목상동음식특화거리)

☐ 향후 계획

- 중리·법동시장 아케이드 보수 공사
- 오정동상점가 및 법동시장 주차환경개선 사업 추진

관리번호 2-2	빈 점포를 활용한 청년창업 지원사업											
주관부서	경제과		일자리팀장 홍성진		☎ 608-4511		담당자 김미애		☎ 608-4514			
사업구분					총사업비 (백만원)	이행도						이행율 (%)
완료시기	사업기간	사업주체 (국가/市/자체)	신규 여부	국책 사업		완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기	
임기 내	23~26년	자체	신규	×	520		○					50
중앙정부 도움 필요성					해당 없음 (√) / 도움 필요 제도() 재정() 권한()							

☐ 사업현황 및 정책목표

- 청년 상인을 육성함으로써 시장 활력 제고 및 청년 일자리 창출
- 새로운 창업 콘텐츠로 지역상권 변화 및 활성화 유도

☐ 사업개요

- (예 산) 연 100백만원
- (대 상) 대덕구 거주 청년(18~39세)
- (사업내용) 청년창업 지원 / 연간 5개 점포, 점포당 20백만원
 - 리모델링 : 최대 10백만원
 - 홍보간판 : 최대 4백만원
 - 임 차 료 : 최대 6백만원(월 50만원 이내) ※ 2년차 임차료 별도 지원

☐ 연차별 로드맵

구 분		2022		2023				2024				2025				2026		임기후	
단위사업	세부추진	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	26년 하반기	27년 이후
청년창업	빈 점포 조사																		
	창업자 공모																		
	리모델링 사업개시																		
	사업지속 추진																		

☐ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계 (총사업비)	임 기 내						임 기 후	확 보 액	집 행 액
		소계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.			
계	520	490	0	100	130	130	130	30	200	113
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
구 비	520	490	0	100	130	130	130	30	200	113
기타(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

☐ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비 고
창업점포	개소	목표	20	-	5	5	5	이행후 계속추진
		실적	10	-	3	7		

☐ 추진실적

그간 추진 실적	○ 청년가게 1호점 개업 및 현판식('23. 7. 5.) ○ 청년가게 2호점 개업('23. 5.) ○ 청년가게 3호점 개업('23. 9.) ○ '24년 청년창업자 모집 공고 및 선발('24. 1. ~ 2.) ○ '24년 청년창업자 2차 모집 공고 및 선발('24. 3. ~ 4.) ○ 청년가게 4호점 개업('24. 4.) ○ '24년 청년창업자 3차 모집 공고 및 선발('24. 5. ~ 6.) ○ 청년가게 5호점 개업('24. 7.) ○ '24년 청년창업자 4차 모집 공고 및 선발('24. 8. ~ 9.) ○ 청년가게 6호점 개업('24. 9.)
이번 분기 추진 실적	○ '24년 청년창업자 5차 모집 공고 및 선발('24. 10. ~ 11.) - 청년창업자 4인 선정

					
청년가게 1호점 (데이드) 현판식	청년가게 2호점 (원포원빈티지)	청년가게 3호점 (오독행)	청년가게 4호점 (카페트라슈)	청년가게 5호점 (소울상점)	청년가게 6호점 (호름)

☐ 향후 계획

- '25년 청년창업자 모집 선발 / 25. 1. ~ 2.

관리번호 2-3		대 덕 구 일 자 리 창 출 종 합 계 획 추 진										
주관부서		경제과	일자리팀장 홍성진 ☎ 608-4511			담당자 홍성진 ☎ 608-4511						
사 업 구 분					총사업비 (백만원)	이 행 도					이행율 (%)	
완료시기	사업기간	사업주체 (국가/市/자체)	신규 여부	국책 사업		완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	보류		폐기
임기내	23~26년	자체	가추진	×	435,185		○					100
중앙정부 도움 필요성					해당 없음 () / 도움 필요 제도() 재정() 권한()							

☐ 사업현황 및 정책목표

- 민선 8기 비전 실현을 위한 성공적인 일자리 유지·창출 모델 구현
- 체계적인 일자리 창출 계획 수립을 통한 고용촉진 및 안정

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 분야별 일자리 목표

3대 분야	10대 중점과제		세부추진 과 제	일자리수				
				합계	'23년	'24년	'25년	'26년
계			200	30,023	7,481	7,493	7,516	7,533
1. 공 공 일 자 리 부 문	1. 직접수행 일자리	1. 누 구 나	58	1,287	323	320	321	323
		2. 청 년	6	88	22	22	22	22
		3. 중 년	6	172	43	43	43	43
		4. 노 인	1	2,094	510	519	528	537
		5. 장 애 인	3	270	67	67	68	68
		6. 취약계층	3	795	195	196	200	204
	2. 직업능력개발		1	4	1	1	1	1
	3. 고용서비스		3	-	-	-	-	-
	4. 창업지원		2	28	7	7	7	7
	5. 산업단지·중소기업 일자리 창출		1	20	5	5	5	5
2. 민 간 일 자 리 부 문	6. 사회적기업·마을기업 일자리 창출		2	531	130	131	134	136
	7. 공익적 사업 일자리	1. 행정	12	236	59	59	59	59
		2. 교육	4	64	16	16	16	16
		3. 문화·관광·체육	14	248	62	62	62	62
		4. 환경	1	8	2	2	2	2
		5. 복지	68	24,016	6,004	6,004	6,004	6,004
		6. 보건	5	92	23	23	23	23
	8. 일자리 창출 제도적 기반 마련		4	-	-	-	-	-
3. 일 자 리 기 반 마 련	9. 일자리 촉진 관련 시설 설치·개선		5	70	12	16	21	21
	10. 문화관광 인프라 구축		1	-	-	-	-	-

☐ 연차별 로드맵

구 분		2022		2023				2024				2025				2026		임기후	
단위사업	세부추진	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	26년 하반기	27년 이후
일 자 리 창 출 중 합 추진	부서 일자리 조사																		
	종합 계획 수립																		
	연차별 계획 추진																		

☐ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계 (총사업비)	임 기 내						임 기 후	확 보 액	집 행 액
		소계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.			
계	435,185	435,185	0	105,781	107,741	109,788	111,875	0	249,410	249,410
국 비	186,983	186,983	0	45,434	46,298	47,177	48,074	0	107,086	107,086
시 비	180,436	180,436	0	43,881	44,664	45,513	46,378	0	102,600	102,600
구 비	67,766	67,766	0	16,466	16,779	17,098	17,423	0	39,724	39,724
기타(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

☐ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적		2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비 고
일자리수	개	목표	30,023	-	7,481	7,493	7,516	7,533	이행 후 계속추진
		실적	14,974	-	7,481	7,493	-	-	

☐ 추진실적

그간 추진 실적	○ 민선8기 일자리 종합 계획 수립('22. 12.) ○ '23년 일자리 대책 연차별 세부계획 수립('24. 3.) ⇨ 목표달성(7,481개) ○ '24년 일자리 대책 연차별 세부계획 수립('24. 1.)
이번 분기 추진 실적	○ '24년 일자리 대책 추진실적 ⇨ 목표달성(7,493개)

☐ 향후 계획

- '25년 일자리 대책 연차별 세부 계획 수립

관리번호 2-4	대덕 중소기업 혁신성장 벨트 조성											
주관부서	경제과		기업지원팀장 박병목 ☎ 608-6481				담당자 김지수 ☎ 608-6483					
사업구분					총사업비 (백만원)	이행도						이행율 (%)
완료시기	사업기간	사업주체 (국가/시/자체)	신규 여부	국책 사업		완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기	
임기 내	22~26년	자체	신규	×	2,040	○						100
중앙정부 도움 필요성					해당 없음 (√) / 도움 필요 제도() 재정() 권한()							

☐ 사업현황 및 정책목표

- 종합계획 및 연차별 계획을 통한 지역산업 발전의 체계구축
- 권역별 특성을 반영한 세부계획 추진에 따른 지역산업 역량 결집

☐ 사업개요

- (사업목적) 권역별·산업군별 연계사업 발굴 및 지원으로 중소기업 경쟁력 마련 및 지역산업 발전 도모
- (사업기간) 2022 ~ 2026년 / 5년간
- (사업내용) 산업군 특성에 맞는 발전계획 수립 및 연계 사업 발굴·추진
- (총사업비) 2,040,000천원
- (수행기관) (재)대덕경제재단

☐ 연차별 로드맵

구 분		2022		2023				2024				2025				2026		임기후	
단위사업	세부추진	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	26년 하반기	27년 이후
대덕 중소기업 혁신성장 벨트 조성	종합계획 수립																		
	세부계획 수립																		
	세부계획 추진																		

☐ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계 (총사업비)	임 기 내						임 기 후	확 보 액	집 행 액
		소계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.			
계	2,040	2,040	120	480	480	480	480	0	1535	1135
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	485	185
시 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
구 비	2,040	2,040	120	480	480	480	480	0	1050	950
기타(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

☐ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비 고
종합계획 용역추진	건	목표	1	-	1	-	-	완료
		실적	1	-	1	-	-	
종합계획 수립	건	목표	1	-	1	-	-	완료
		실적	1	-	1	-	-	

☐ 추진실적

그간 추진 실적	○ 종합계획 용역 추진 - 대덕 중소기업 혁신성장 벨트 조성 용역 완료('23. 3. 7.) ○ 세부사업 계획 및 추진 - 산업혁신 인재교육 추진('23. 2. 7. ~ 9.) - 해외마케팅팀 구축지원사업 추진('23. 4. ~ 12.) - 공모사업 제안서 품질향상 지원사업 추진('23. 7. ~) - 제조 중소기업 구조전환 지원사업 추진('23. 7. ~) - 기술·디자인 고도화 지원사업 추진('24. 3. ~) ○ 대덕 중소기업 혁신성장 벨트 조성 종합계획 수립('23. 11.) ○ 공모사업제안서 품질향상 지원사업 추진(' 24. 5.)
	이번 분기 추진 실적 ○ 제조 중소기업 구조전환 지원사업 추진('24. 10~)

☐ 향후 계획

- 미완료 사업 지속 추진

관리번호 2-5	대덕구 반려동물 놀이터 조성											
주관부서	에너지산업과		동물정책팀장 신광연 ☎ 608-6951				담당자 정인영 ☎ 608-6953					
사업구분					총사업비 (백만원)	이행도						이행율 (%)
완료시기	사업기간	사업주체 (국가/시/자체)	신규 여부	국책 사업		완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기	
임기내	22~26년	자체	신규	×			○					40
중앙정부 도움 필요성					해당 없음 (√) / 도움 필요 제도() 재정() 권한()							

☐ 사업현황 및 정책목표

○ 구민이 동물과 교감하며 여가를 즐길 수 있는 놀이터 조성

☐ 사업개요

- (목 적) 반려인과 비반려인의 문제점 해소 및 이해의 장 마련
- (기 간) '22. 10. ~ '25. 10.
- (내 용) 반려견이 목줄 없이 운동 및 휴식을 할 수 있는 공간
- (효 과) 주민 여가문화 수준과 삶의 질 향상 및 공감대 형성

☐ 연차별 로드맵

구 분		2022				2023				2024				2025				2026	
단위사업	세부추진	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4
반려동물 놀이터 조성	공약사항 변경 및 조성계획 수립																		
	실시설계 용역 등																		
	놀이터 개장																		

☐ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계 (총사업비)	임 기 내						임 기 후	확 보 액	집 행 액
		소계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.			
계	300	300	0	0	0	300	0	0	0	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
구 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타(민자)	300	300	0	0	0	300	0	0	0	0

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비 고
반려동물 놀이터 조성	개소	목표 1	-	-	-	-	1	정상추진
		실적 0	-	-	-	-	-	

□ 추진실적

그간 추진 실적	○ 2023. 1월 : 도시공원 및 녹지조례 개정 건의 / 대전시 ○ 2023. 3월 : 놀이터 조성 관련 업무회의 협조 / 한국도로공사 ○ 2023. 10월 : 놀이터 예정 대상지(신대동 21-3일원) 협의 / 한국도로공사 ○ 2024. 4월 : 고속도로 유휴부지 활성화 사업 연계 협의 / 한국도로공사 ○ 2024. 7월 : 반려동물 놀이터 조성 관련 업무협약 체결 / 한국도로공사
이번 분기 추진 실적	○ 2024. 11월 : 놀이터 조성 관련 특별조정교부금 3억원 확보 / 대전시

대전시 2024년 자치구 방문 행사 주민 건의

특별조정교부금 교부결정 통보 공문

□ 문제점 및 대책

- 市 특교금 지원 조건으로 기존 예정지 대신 타 지역에서의 사업 추진 요구
 - 사유: 예정지가 기존 놀이터와 인접(3~4km)하며, 고속도로 차량 소음 및 분진 등의 문제가 우려됨
- 기존 예정지의 적합성 재검토 및 대체 부지 탐색 진행 예정

□ 향후 계획

- 2025. 1월 ~ 2월 : 놀이터 적합 부지 탐색 및 조성계획 수립
- 2025. 3월 ~ 10월 : 공사 착공 및 반려동물 놀이터 개장

관리번호 3-1	대덕구 대표축제 발굴 · 육성
-------------	------------------

주관부서	문화관광체육과	관광축제팀장 김정하 ☎ 608-6731	담당자 전홍수 ☎ 608-6735 담당자 최지예 ☎ 608-6732
------	---------	-----------------------	--

사 업 구 분					총사업비 (백만원)	이 행 도						이행율 (%)
완료시기	사업기간	사업주체 (국가/市/자체)	신규 여부	국책 사업		완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기	
임기내	22~26년	자체	신규	×	2,510		○					100
중앙정부 도움 필요성					해당 없음 (√) / 도움 필요 제도() 재정() 권한()							

☐ 사업현황 및 정책목표

- 대덕만의 차별화된 문화관광형 축제로 지역을 넘어 전국 대표 축제로 발돋움
- 축제를 통한 외부 관광객 유입으로 지역경제 활성화 및 구 브랜드가치 향상

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년 / ※ 2024 대덕물빛축제 : 2024. 3. 29.(금) ~ 5. 6.(월), 39일간
- 사업내용 : 천혜자연 대청호에서 스토리를 입힌 대덕만의 대표축제 실시
 - － 대청호대덕뮤직페스티벌 : 벚꽃과 함께하는 힐링 뮤직페스티벌 / 본행사 기간
 - － 체험프로그램, 지역예술인과 연계한 프린지무대 운영, 루미페스타, 경관조명 조성 등

☐ 연차별 로드맵

구분		2022		2023				2024				2025				2026		임기후	
단위사업	세부추진	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	26년 하반기	27년 이후
대덕구 대표축제 발굴 육성	사업계획 수립			■			■	■			■				■				
	프로그램 구상			■	■		■			■	■			■	■				
	업체 선정 등			■			■				■				■				
	축제 추진				■				■				■				■		

☐ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (총사업비)	임기내						임기후	확보액	집행액
		소계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.			
계	1,196	1,196	0	290	296	302	308	0	2,760	2,760
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시비	0	0	0	0	0	0	0	0	550	550
구비	1,196	1,196	0	290	296	302	308	0	2,210	2,210
기타(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비 고
대표 축제 발굴·육성	건	목표	1	-	1	-	-	
		실적	2	-	1	-	-	

□ 추진실적

그간 추진 실적	○ 2024 대덕물빛축제 축제 개최 - (일정) 2024. 3. 29.(금) ~ 5. 6.(월), 39일간 / 대청공원 일원 - (주요프로그램) KBS 전국노래자랑, 루미페스타, 대청호대덕뮤직페스티벌, 어린이페스티벌, 고래설화스토리북 기획전시, 효(孝)콘서트 등 - (성과) 방문객 70만명, 직접경제효과 약195억, 프린지무대 공연자 700여명, 관광형 문화축제 확립, 주민참여 강화, 협력기업 확대, 170일간 홍보 등 ○ 2024 대덕물빛축제 축제 성과평가 추진 - (최종성과보고회) 24. 5. 30.(목), 대회의실 / 성과보고 및 발전방안 논의
이번 분기 추진 실적	○ 2025 대덕물빛축제 추진 준비 - (일정) 2025. 3. 28.(금) ~ 4. 26.(토), 30일간(예정) / 대청공원 일원 - (주요프로그램) 뮤직페스티벌, 테마관련 경관 조명, 프린지 무대 등 - 2025 대덕물빛축제 주민참여공모 실시



대덕물빛축제 현장 사진



2024 대덕물빛축제 포스터



2024 대덕물빛축제 보도자료

□ 향후 계획

- 2025 대덕물빛축제 준비
 - 전문 TF 구성·운영, 부서연계행사 발굴
 - 2025 대덕물빛축제 계획 수립
- 관광프로그램 발굴 및 축제와 연계를 통한 관광형 문화축제 구축

관리번호 4-1	행복한 100세시대 만들기! 대덕형 마을돌봄사업
-------------	----------------------------

주관부서	복지정책과	통합돌봄정책팀장 김영례 ☎ 608-4761 통합돌봄사업팀장 안은선 ☎ 608-4611	담당자 이정현 ☎ 608-4762 담당자 이승복 ☎ 608-4612
------	-------	--	--

사 업 구 분					총사업비 (백만원)	이 행 도						이행율 (%)
완료시기	사업기간	사업주체 (국가/市/자체)	신규 여부	국책 사업		완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기	
임기내	22년~계속	자체	가결	×	4,580		○					100
중앙정부 도움 필요성					해당 없음 () / 도움 필요 제도() 재정() 권한()							

□ 사업현황 및 정책목표

○ (사업현황)

- 대덕구 동네돌봄 위킹그룹 운영 및 커뮤니티케어 전담팀 신설('19.3.~10.)
- 대덕구 동네돌봄지원 조례 및 시행규칙 제정('19.10.)
- 동네돌봄 주민욕구조사 및 모델개발 연구용역('20.5.~10.)
- 대전시 지역사회통합돌봄 시범사업 공모 선정('20.8.)
- 대덕구 동네돌봄 업무 협약(사회복지, 의료기관 등 32개소)('21.~)
- 어르신틈새돌봄, 주거튼튼사업 등 대전시 주민참여예산 선정('21.~'22)
- 행안부 주민생활현장공공서비스 연계 공모 선정('22.2.)
- 마을돌봄 실무자 및 관계자 팀러닝, 워크숍 등 실시('22.5.~'22.12.)
- 조직개편으로 복지정책과 內 통합돌봄 2개팀 확대('23.1.)
(기존) 통합돌봄팀(1) -> (변경) 통합돌봄정책팀 · 사업팀(2)
- 2023년 대덕형 마을돌봄서비스 추진 계획 수립('23.2.)
- 대전시 인구감소 및 저출생 공모사업 선정[어르신돌봄놀이터(노슈) 조성]('23.2.)
- 2023년 대덕형 마을돌봄서비스 제공기관 공모 및 협약(12개소/'23.3.)
- 보건복지부 노인 의료·돌봄 통합지원 시범사업 공모 선정('23.3.)
- 방문의료지원센터 운영(양방3개소, 한방6개소)컨소시엄 구성 및 협약(9개소/'23.8)
- 2024년 대덕형 마을돌봄서비스 추진 계획 수립('24.1.)
- 2024년 대덕형 마을돌봄서비스 제공기관 공모 및 협약(13개소/'24.3.)
- 『의료요양 등 지역돌봄의 통합지원에 관한 법률』 통과('24.3.) / '26.3 돌봄사업 전국화
- 케어안심주택 개소 및 12호 입주완료('24.10.)
- 2025년 대덕형 마을돌봄서비스 제공기관 공모 및 협약(12개소/'24.12.)

- (정책목표) 지역사회 통합돌봄 대상자인 노인, 장애인, 가족돌봄청년 등이 살던 곳에서 개개인의 욕구에 맞는 서비스를 누리고 지역사회와 함께 살아갈 수 있도록 주거, 영양, 보건의료, 요양돌봄, 독립생활 지원을 통합적으로 제공

□ 사업개요

- 사업목적 : 고령층, 장애인, 1인 가구 증가 등 인구구조 변화에 따른 돌봄 제공
- 사업기간 : 2022. 7. ~ 계속
- 사업내용 : 민·관 협력을 통해 대상자 발굴, 복지사각지대 해소 등 대덕형 마을돌봄 서비스 구현

□ 연차별 로드맵

구 분		2022		2023				2024				2025				2026		임기후	
단위사업	세부추진	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	26년 하반기	27년 이후
대 덕 형 마을돌봄	민관협력 거버넌스																		
	요양·돌봄																		
	건강·의료																		
	주거개선																		
	스마트 돌봄																		

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계 (총사업비)	임 기 내						임 기 후	확 보 액	집 행 액
		소계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.			
계	4,580	3,680	380	700	800	900	900	400	3,326	2,536
국 비	560	460	60	100	100	100	100	100	872	613
시 비	2,792	2232	202	420	490	560	560	60	1590	1236
구 비	1,228	988	118	180	210	240	240	240	864	687
기타(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적		2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비 고
대상자 수	명	목표	3,000	2,000	2,300	2,600	2,900	3,000	이행 후 계속추진
		실적	6,595	4,437	1,882	1,072	-	-	
예산액	백만원	목표	900	380	700	800	900	900	이행 후 계속추진
		실적	1,571	100	480	1,066	-	-	

□ 추진실적

간접적 추진실적	○ 요양·돌봄: 572명 / 14,386건 / 방문돌봄 및 영양급식 등 제공 ○ 건강·의료: 149명 / 2,042건 / 방문진료 시 본인부담금 지원 ○ 주거개선: 46명 / 노인맞춤형주택개조 실시 ○ 스마트돌봄: 349명[스마트홈(AI스피커) 257명]
이번기 추진실적	○ 대덕구 케어안심주택 기관공급 계약 및 입주자 모집(11세대) ○ 요양·돌봄: 187명 / 3,740건 / 방문돌봄 및 영양급식 등 제공 ○ 건강·의료: 58명 / 1,382건 / 방문진료 시 본인부담금 지원 ○ 주거개선: 53명 / 노인맞춤형주택개조 실시 ○ 스마트돌봄: 86명[스마트홈(AI스피커) 86명]

 'k-돌봄 대표도시' 대전 대덕구, 돌봄건강학교 성과 특목 지난 8월 조사 결과 이어 건강 호전·우울 감소 등 효과 가뒀 돌봄돌봄 우수사례 등 전국 각지서 외부강의 요청 쇄도 대전 입력 2024.11.28 11:19 최 500자	 "살던 곳에서 노후까지"... 대전 대덕구, '대덕형 마을돌봄 서비스' 제 공기관 업무협약 체결 윤준혁 입력 2024.12.20 16:49 댓글 0 일시제가·이동지원 등 돌봄 서비스 제공... '지역사회 대덕돌봄 ON(온)' 실현 최종규 구청장 "고령사회 대비 통합지원 전국 확산 앞뒤... 시스템 구축 만전" 추천뉴스* 대전 서구에 35만 명 산업을 지 추가 개발 프랜차이즈 업체 종사자 사심 첫 100만 명 돌파 [광산] 무조라 불행등에 맞선 대전 시민사회 '영(南)관' 두들. 관영세 국민 의원 비대위원장 지명 '시간열기'를 대명. 탄력 되 나...를 '내란' 전쟁 진압
보도자료(돌봄건강학교 성과 등)	보도자료(2025년 제공기관 협약식 등)

□ 문제점 및 대책

- (문제점) 통합돌봄 정책실현을 위해 병원 등 다양한 민간기관 연계 및 더 많은 사람이 지원 받을 수 있도록 홍보 필요
- (대 책) 지역사회보장협의체, 복지만두레, 병원, 사회적경제조직, 지역리더 등 통합돌봄 교육 등을 통한 연계 협력 지속 및 적극 홍보 노력

□ 향후 계획

- 대덕형 마을돌봄(민관협력 거버넌스, 요양돌봄, 건강의료, 주거개선, 스마트돌봄) 2025년 지속 추진

관리번호 4-2	국가보훈대상자 지원 확대
-------------	---------------

주관부서	복지정책과	복지정책팀장 김기섭 ☎ 608-6761	담당자 권하정 ☎ 608-6763
------	-------	-----------------------	--------------------

사 업 구 분					총사업비 (백만원)	이 행 도						이행율 (%)
완료시기	사업기간	사업주체 (국가/市/자체)	신규 여부	국책 사업		완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기	
임기내	23년~계 속	자체	신규	×	3,646		○					100
중앙정부 도움 필요성					해당 없음 (√) / 도움 필요 제도() 재정() 권한()							

☐ 사업현황 및 정책목표

- 국가유공자와 유족들이 자긍심을 갖고 영예로운 삶을 영위할 수 있도록 경제적 보상 등 복지혜택 강화

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 계속
- 사업대상 : 대덕구에 주소를 둔 국가보훈대상자 및 보훈단체
- 사업내용 : 국가보훈대상자 명절 위문(연 2회 / 설·추석 5만원),
참전유공자 명예수당 인상(구비 월 5만원 / 2만원 인상),
보훈단체 지회장 활동비 인상(월 20만원 / 10만원 인상) 등
지원사업 확대 실시

☐ 연차별 로드맵

구분		2022		2023				2024				2025				2026		임기후	
단위사업	세부추진	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	26년 하반기	27년 이후
국가보훈 대상자 지원 확대	세부계획 수립																		
	본예산 편성																		
	지원 확대 추진																		

☐ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (총사업비)	임기내						임기후	확보액	집행액
		소계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.			
계	3,646	2,916.8	0	729.2	729.2	729.2	729.2	729.2	1,458.4	1,194.6
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
구비	3,646	2,916.8	0	729.2	729.2	729.2	729.2	729.2	1458.4	1,194.6
기타(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

☐ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비 고
세부계획수립	건	목표 1	1	-	-	-	-	완료
		실적 1	1	-	-	-	-	
지원 확대 실행	식	목표 3	-	3	-	-	-	이행 후 계속추진
		실적 3	-	3	-	-	-	

☐ 추진실적

그간 추진 실적	○ 국가보훈대상자 위문품 지급 - 2023년 설·추석 명절, 호국보훈의 달, 광복절 위문 등 : 198백만원 - 2024년 설 명절 위문: 1,571명 / 78.6백만원 - 2024년 호국보훈의 달 위문품 지급: 1,880명 / 37.6백만원(구비) - 2024년 대전보훈병원 입원 국가유공자 위문: 300명 / 8.7백만원(구비) - 2024년 광복절 독립유공자 및 유족 위문: 18명 / 1.8백만원(구비) - 2024년 추석 명절 위문: 1,631명 / 81.6백만원(구비) ○ 보훈수당 지급 / 매월 25일 - 참전유공자 명예수당(구비) : 월 평균 670여명 / 303.9백만원 - 보훈예우수당(구비) : 월 평균 460여명 / 121.2백만원 ○ 보훈단체 지회장 활동비 지급 : 8명 / 21.6백만원 ○ 대전광역시 대덕구 국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례 개정(23.10월) - 보훈예우수당 지급대상자 확대 / 공상공무원·순직공무원 추가 ○ 공상공무원 본인·순직공무원 유족 보훈예우수당 확대 지급 실시 / 2024. 7월 ~
이번 분기 추진 실적	○ 보훈수당 지급 / 145.8백만원 - 참전유공자 명예수당(구비) : 1,981명 / 99.8백만원 - 보훈예우수당(구비) : 1,444명 / 44.6백만원 ○ 보훈단체 지회장 활동비 지급 : 8명 / 7.2백만원(월 30만원)

☐ 향후 계획

- 보훈수당 및 보훈단체 지회장 활동비 지급 / 매월
- 2025년 설 명절 위문 / 2025. 1월 중
- 2025년 참전명예수당 구비 인상 / 2025. 1월 ~ 계속


관리번호 4-3	1인 가구 모바일 안심케어 서비스												
주관부서	생활지원과		희망복지팀장 노미란 ☎ 608-6741				담당자 윤 정 ☎ 608-6742						
사업구분						총사업비 (백만원)	이행도						이행율 (%)
완료시기	사업기간	사업주체 (국가/시/자체)	신규 여부	국책 사업	완료		이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기		
임기내	22~26년	자체	가중진	×	340		○					100	
중앙정부 도움 필요성						해당 없음 (√) / 도움 필요 제도() 재정() 권한()							

□ 사업현황 및 정책목표

- 1인 가구를 위한 차별화된 고독사 예방 서비스 및 안전망 구축
- 독거노인에게 집중되는 복지서비스로 인해 사각지대에 놓인 고위험 1인 중장년 가구를 위한 맞춤형 안부확인 서비스 운영

□ 사업개요

- 사업목적 : 1인 가구 증가에 따른 고독사 예방 및 사회안전망 구축
- 사업기간 : 2022. 9월 ~
- 사업대상 : 관내 고위험 1인 가구(저소득 및 50~64세 우선)
- 사업내용 : 정보통신기술을 활용한 모바일 안부확인 시스템구축·운영
 - 대상자의 유·무선 전화 통화이력을 자동으로 모니터링하여 일정기간 통화기록이 없을 경우, 자동안부전화를 발신하여 이중으로 안부 확인 후, 미수신하는 경우 동 행정복지센터로 실시간 확인요청 알림을 통보해주는 시스템
- 시스템구축 : 서버 구축 및 중계서버 연계
 - 서비스구성 : 안심케어서비스 3.0 + 자동안부전화 서비스
- 시스템운영



□ 연차별 로드맵

구 분		2022		2023				2024				2025				2026		임기후	
단위사업	세부추진	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	26년 하반기	27년 이후
모바일 안부확인 시스템	시스템구축																		
	시스템운영																		

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계 (총사업비)	임 기 내						임 기 후	확 보 액 (예산편성액)	집 행 액
		소계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.			
계	340	340	94	60	60	62	64	64	135	126
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
시 비	123	123	0	30	30	31	32	0	11	5
구 비	123	123	0	30	30	31	32	0	26	25
기타(민자)	94	94	94	0	0	0	0	0	94	92

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비 고
시스템 구축	식	목표	1	1	-	-	-	이행 후 계속추진
		실적	1	1	-	-	-	

추진실적

그간 추진 실적	○ 2022. 9월 시스템 구축 환경 조성을 위한 연합 회의 및 보안성 검토 - 전산·통신·SMS연계·보안 등 네트워크 환경 조정 / 시·구 정보화담당 ○ 2022. 11월 시스템 구축 완료 / 대전광역시스마트도시통합센터 ○ 2022. 11. 8.(화) 서버설치 및 테스트 완료에 따른 본격 운영 시작 ○ 2022. 11월 ~ 대상자 안부확인·모집·홍보 등 지속추진 ○ 2024. 3분기 948명 안부확인 모니터링
이번 분기 추진 실적	○ 2024. 10월 ~ 12월 시스템 이용료 집행/ 6,600천원 ○ 2024. 4분기 965명에 대한 안부확인 모니터링 운영 중 ○ 2025년 모바일안심케어서비스 유지보수 계획 수립 및 계약체결(24.12월) ○ 대상자 모집 및 고독사 예방을 위한 이웃 주민에 대한 관심 홍보

대덕구, '모바일 안심케어서비스'로 1일 가꾸기 생생 구했다

대덕구 생활지원과, 대덕구 주민자치센터, 대덕구 주민자치회

대덕구 생활지원과, 대덕구 주민자치센터, 대덕구 주민자치회

대덕구 생활지원과, 대덕구 주민자치센터, 대덕구 주민자치회

대덕구 생활지원과, 대덕구 주민자치센터, 대덕구 주민자치회

대상자 현황

총 / 신규 / 삭제 / 전환

대상자 현황(이전월 기준)

전체	965명	신규	2명	삭제	3명
----	------	----	----	----	----

대상자 생일보통명 현황

생일(이전월)

구분	생일(이전월)	성별		보통명							유지보수	
		남	여	기초수급	차상위	일반	연가수급	기	총	고		
총계	965	407	558	571	79	197	118	939	21	5		
노년층	245	67	78	62	8	30	45	233	19	3		
대학생	38	14	24	13	12	5	8	37	1	0		
대학원	78	31	47	35	11	18	14	79	0	0		
대학원	101	43	58	93	5	1	2	101	0	0		
대학원	64	23	41	42	15	2	5	64	0	0		
대학원	45	40	25	58	1	6	0	42	1	2		
대학원	61	29	32	50	3	5	3	61	0	0		
대학원	144	56	88	127	5	6	6	144	0	0		
대학원	113	50	63	25	6	42	0	113	0	0		
대학원	86	19	67	27	8	36	15	86	0	0		
대학원	25	22	13	27	2	4	2	25	0	0		
대학원	25	13	22	12	3	2	18	25	0	0		

대상자 현황	대상자 현황(이전월 기준)	대상자 현황(이전월 기준)	대상자 현황(이전월 기준)
대상자 현황	대상자 현황	대상자 현황	대상자 현황
대상자 현황	대상자 현황	대상자 현황	대상자 현황
대상자 현황	대상자 현황	대상자 현황	대상자 현황

2025년 모바일안심케어서비스 유지보수 추진계획

대덕뉴스('24.03.08.)

2024. 4분기 지원 대상자 현황

2025년 모바일안심케어서비스 유지보수 추진계획

향후 계획

- 적극적 모집 홍보로 대상자 확대 및 고독사 예방을 위한 주민 관심 제고

관리번호 4-4	경로당 지역봉사지도원 활동비 지원 확대
-------------	-----------------------

주관부서	노인장애인과	노인정책팀장 박진영 ☎ 608-6771	담당자 김기석 ☎ 608-6772
------	--------	-----------------------	--------------------

사 업 구 분					총사업비 (백만원)	이 행 도						이행율 (%)
완료시기	사업기간	사업주체 (국가/市/자체)	신규 여부	국책 사업		완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기	
임기내	23년~계속	자체	가류진	×	960		○					100
중앙정부 도움 필요성					해당 없음 (√) / 도움 필요 제도() 재정() 권한()							

☐ 사업현황 및 정책목표

- 경로당 운영의 효율성 증대 및 활성화로 노인복지증진 기여
- 경로당 회장·사무장에 대한 처우개선을 통한 자긍심 고취

☐ 사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 계속
- 대 상 : 경로당 129개소 회장·사무장, 대덕구지회장 * 현재 126개소, 예비 등록 3개소 포함
- 내 용 : 경로당의 효율적 운영 등을 위해 회장·사무장을 지역봉사지도원으로 위촉 및 활동비 23년부터 확대 지원(회장 5→10만원, 사무장 비지원→10만원)
- 근 거 : 노인복지법 제24조 및 같은 법 시행령 제18조, 시행규칙 제7조

☐ 연차별 로드맵

구 분		2022		2023				2024				2025				2026		임기후	
단위사업	세부추진	1	2	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	26년 하반기	27년 이후
지역봉사지도원 활동비 지원	위촉 및 지원																		

☐ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계 (총사업비)	임 기 내						임 기 후	확 보 액	집 행 액
		소계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.			
계	960	768	0	192	192	192	192	192	634	614
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시 비	0	0	0	0	0	0	0	0	305	295
구 비	960	768	0	192	192	192	192	192	329	319
기타(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비 고
계획 수립 및 지원	식	목표	1	-	1	-	-	이행 후 계속추진
		실적	1	-	1	-	-	

□ 추진실적 (24. 12월말 현재)

그간 추진 실적	○ 2022년 1월 ~ 12월 : 매월 경로당 회장 월 5만원 지급 ○ 2022년 10월 : 지역봉사지도원 대상 확대(회장→회장·사무장) 및 예산 확보 ○ 2023년 1월 ~ 12월 : 경로당 회장·사무장 월 10만원 지급
이번 분기 추진 실적	○ 4분기 경로당 126개소 총 251명(지회장 포함) 활동비 75,000천원 지급

활동사진

"내 일상이 즐거운 대덕구"

대전광역시 대덕구

수신 내부결재

(경유)

제목 2024년 12월 경로당 지역봉사지도원 활동비 지급결의

노인장애편과-3393호(2024.1.23.)호와 관련, 관내 경로당 지역봉사지도원(회장, 사무장) 12월 활동일지 제출에 따라 아래와 같이 지역봉사지도원 활동비를 지급하고자 합니다.

1. 교부 내역

(단위:원)

사업명	예산액	기지급액	금회지급액	지급액 누계	잔액
지역봉사지도원 활동비(시비)	309,600,000	272,300,000	25,000,000	297,300,000	12,300,000

2. 산출기초 : 100,000원 × 250명 = 25,000,000원

3. 지급대상 : 관내 126개 경로당 지역봉사지도원(회장, 사무장) **총 252명중 250명 지급**
- 지급 제외(2명) : 뒷말경로당 회장(입원), 뒷말경로당 사무장(공석)

4. 활동내용 : 2024년 12월분 지역봉사지도원 활동비

5. 지급방법 : 지역봉사지도원 개인 계좌입금(불입참조)

6. 예산과목 : 노인복지증진-저소득층노인지원-지역봉사지도원활동비(시비)-기타보상금(301-14)

붙임 1. 2024년 12월 지역봉사지도원 활동 일지(압축) 250부,

2. 보조금 지급 내역 1부. 끝.

예산집행

□ 향후 계획

- 2025년부터 지역봉사지도원(회장·사무장) 월 활동비(10만원→20만원) 추가 지급

관리번호 4-5		노후 경로당 리모델링 사업											
주관부서		노인장애인과		노인정책팀장 박진영 ☎ 608-6771				담당자 김기석 ☎ 608-6772					
사업구분						총사업비 (백만원)	이행도						이행율 (%)
완료시기	사업기간	사업주체 (국가/시/자체)	신규 여부	국책 사업	완료		이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기		
임기내	23년~계속	자체	신규	×	1,000		○					75	
중앙정부 도움 필요성					해당 없음 (√) / 도움 필요 제도() 재정() 권한()								

☐ 사업현황 및 정책목표

- 어르신들의 대표 쉼터인 경로당을 안전·쾌적한 고령 친화적 환경 조성
- 노후 기반시설 개선으로 어르신들의 삶의 질 향상과 여가 복지증진 기여

☐ 사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 계속
- 대 상 : 노후(25년 이상 경과 된) 경로당 중 선별
- 내 용 : 노후 시설에 대한 불편 해소 및 안전성 확보를 위해 경로당 리모델링(대수선)을 통해 경로당 기능 강화

☐ 연차별 로드맵

구 분		2022		2023				2024				2025				2026		임기후	
단위사업	세부추진	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	26년 하반기	27년 이후
노후경로당 리모델링	리모델링																		

☐ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)



구 분	합 계 (총사업비)	임 기 내						임 기 후	확 보 액	집 행 액
		소계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.			
계	1,000	800	0	200	200	200	200	200	958	914
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시 비	0	0	0	0	0	0	0	0	308	306
구 비	1,000	800	0	200	200	200	200	200	650	608
기타(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

☐ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비 고
노후 경로당 리모델링	개소	목표	8	-	2	2	2	이행 후 계속추진
		실적	6	-	2	4	-	

☐ 추진실적 (24. 12월말 현재)

그간 추진 실적	○ 2023년 3월 : 노후 경로당 리모델링 기본계획 수립 ○ 2023년 노후경로당 리모델링(2개소) / 신촌, 새뜸 경로당 ○ 2024년 4월 신일경로당 증축에 따른 화장실 증설 및 도배·창호 교체 ○ 2024년 5월 중리제경로당 증축에 따른 장애인 편의시설 개선 및 화장실 리모델링
이번 분기 추진 실적	○ 2024년 11월 노후경로당 리모델링 완료 / 회덕동 신대, 목상동 남해

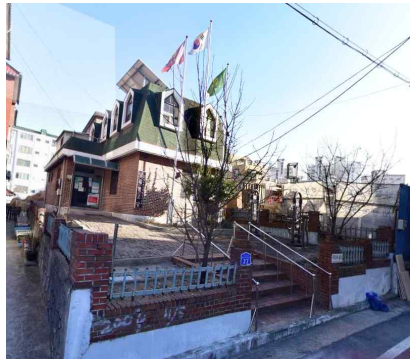		
기본계획 수립	신대경로당	남해경로당

☐ 향후 계획

- 2025. 1. ~ 8. : 노후경로당 리모델링 공사 추진 / 회덕동 상산, 목상동 들말

관리번호 4-6	장애인단체 자립 환경 구축사업
-------------	------------------

주관부서	노인장애인과	장애인복지팀장 이은하 ☎ 608-6801	담당자 이은하 ☎ 608-6801
------	--------	------------------------	--------------------

사 업 구 분					총사업비 (백만원)	이 행 도						이행율 (%)
완료시기	사업기간	사업주체 (국가/市/자체)	신규 여부	국 책 사 업		완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기	
임기내	23~25년	자체	가류진	×	500	○						100
중앙정부 도움 필요성					해당 없음 (√) / 도움 필요 제도() 재정() 권한()							

☐ 사업현황 및 정책목표

- 장애인단체 사무실 이전 지원으로 재정부담 경감 및 사기진작
- 장애인쉼터 개설로 장애인 삶의 질 향상 및 장애인 복지 증진

☐ 사업개요

- 지체장애인협회 대덕구지회 사무실 이전지원 및 장애인 쉼터 개설
- 시각장애인협회 대덕구지회 사무실 개설

☐ 연차별 로드맵

구분		2022		2023				2024				2025				2026		임기후	
단위사업	세부추진	1	2	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	26년 하반기	27년 이후
장애인단체 자립 환경 구축	지체장애인 사무실 이전 및 장애인 쉼터 개설																		
	시각장애인 단체 사무실 개설																		

☐ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)


구분	합계 (총사업비)	임기내						임기후	확보액	집행액
		소계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.			
계	500	500	0	400	100	0	0	0	500	500
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
구비	500	500	0	400	100	0	0	0	500	500
기타(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

☐ 공약달성 확인지표


확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비 고
지체장애인의 사무실 이전 및 쉼터 개설	개소	목표	2	-	-	2	-	완료
		실적	2	-	1	1	-	
시각장애인의 사무실 개설	개소	목표	1	-	-	-	1	완료
		실적	1	-	-	1	-	

☐ 추진실적


그간 추진 실적	○ 지체장애인협회 사무실 이전 - 사업 예산 확보('22. 4분기) - 지장협 사무실 임대계약, 선진지 견학('23. 2분기) - 지장협 사무실 리모델링 공사 착공('23. 3분기) 및 준공('23. 4분기) ○ 장애인쉼터 개설 - 장애인쉼터예정지 임대계약('23. 2분기) - 리모델링사업 예산확보('24. 2분기) - 리모델링공사 설계 용역('24. 3분기)
이번 분기 추진 실적	○ 장애인쉼터 개설 - 장애인쉼터 리모델링공사 및 물품구입 완료 ○ 시각장애인협회 사무실 개설 - 사무실 공간확보 및 개설 완료

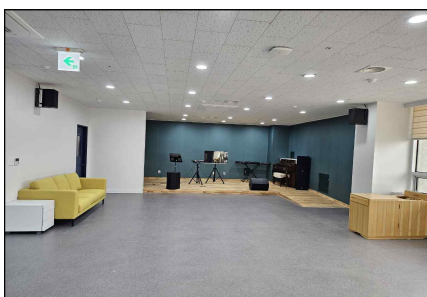

장애인쉼터 리모델링 완료



장애인쉼터 물품구입

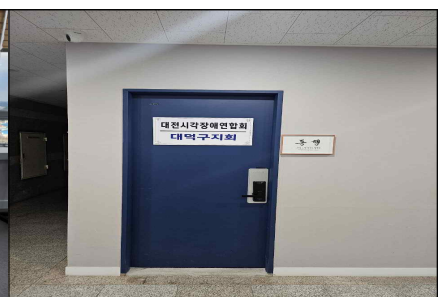

시각장애인 사무실 개설

☐ 문제점 및 대책

- 장애인쉼터 운영 지원 확대 필요 - 운영비 및 인력 보강방안 강구

☐ 향후 계획

- 2025. 1. 2. 운영개시
- 2025. 1. 21. 장애인쉼터 및 시각장애인연합회 사무실 개소식 개최

관리번호 4-7	출생축하금 및 산모회복비 지원				
-------------	------------------	--	--	--	--

주관부서	가족친화과	여성친화팀장 장윤희 ☎ 608-6781	담당자 최유리 ☎ 608-6784
	건강정책과	건강보건팀장 이희옥 ☎ 608-5481	- -

사 업 구 분					총사업비 (백만원)	이 행 도						이행율 (%)
완료시기	사업기간	사업주체 (국가/市/자체)	신규 여부	국책 사업		완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기	
임기내	23년~계속	자체	부	×	3,410			○				75
중앙정부 도움 필요성					해당 없음 (√) / 도움 필요 제도() 재정() 권한()							

☐ 사업현황 및 정책목표

- 출산으로 인한 산모의 건강회복 및 자녀 양육으로 인한 경제적 부담을 해소하고 건강한 출산환경 조성

☐ 사업개요

- 사업목적 : 산모 산후의 건강회복과 안정적인 출산 및 양육환경 조성
- 사업기간 : 2023년 ~ 계속
- 사업대상 : 관내 출산가정(연간 약 800여명)

☐ 연차별 로드맵

구 분		2022		2023				2024				2025				2026		임기후	
단위사업	세부추진	1	2	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	26년 하반기	27년 이후
출생축하금	출생축하금지원																		
산모회복비	산모회복비지원																		

☐ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계 (총사업비)	임 기 내						임 기 후	확 보 액	집 행 액
		소계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.			
계	3,410	3,410	210	800	800	800	800	0	1,049	983.7
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
구 비	3,410	3,410	210	800	800	800	800	0	1,049	983.7
기타(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

☐ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비 고
계 획 수 립	건	목표	2	1	-	1	-	완료
		실적	2	1	-	1	-	
확 대 추 진	건	목표	2	-	-	-	1	
		실적	1	-	1	-	-	

☐ 추진실적

그간 추진 실적	○ 대덕구 출산장려금 확대지원 - 2022년 30만원 지급 ⇒ 2023년 출생아부터 50만원 지급(대전 최초) ○ 2022 ~ 2023년 출산장려금 지원 실적 - 2022년 813명 244.6백만원, 2023년 712명 349.6백만원 지원 ○ 2024년 3분기까지 출산장려금 지원 실적 - 지원대상 573명, 집행액 286.5백만원 ○ 2024년 8월 출산장려금 명칭 변경에 따른 조례 개정 계획수립 ○ 2024년 8월 2025년 대덕구 산모회복비지원 계획수립
이번 분기 추진 실적	○ 2024년 4분기 출산장려금 지원 실적 - 지원대상자 : 208명, 집행액 : 104백만원 ○ 2024년 12월 출산장려금에서 ‘출생축하금’ 명칭 변경에 따른 조례 개정 완료 ○ 2024년 12월 2025년 본예산 의결(산모회복비지원)

☐ 문제점 및 대책

- 출산장려금 외 산모건강회복지원금 별도 편성하여 임기내 목표액 100% 달성

☐ 향후 계획

- 대덕구 ‘출산장려금’ 명칭을 2025년부터 ‘출생축하금’ 으로 변경 사용 및 홍보
- 산모 건강회복 지원금 신설 및 지원 / 건강정책과(2025. ~)

관리번호 4-8		안전하고 즐거운 보육환경 조성										
주관부서		가족친화과		보육지원팀장 옥지영 ☎ 608-6971				담당자 갈매영 박지원 김민지 ☎ 608-6972,45				
사업구분					총사업비 (백만원)	이행도						이행율 (%)
완료시기	사업기간	사업주체 (국가/시/자체)	신규 여부	국책 사업		완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기	
임기내	23~계속	자체	신규	×	4,656		○					100
중앙정부 도움 필요성					해당 없음 (√) / 도움 필요 제도() 재정() 권한()							

☐ 사업현황 및 정책목표

- 보육교직원 처우개선 및 대체교사 지원 활성화를 통한 즐거운 환경 조성
- 안심보육 운영비 지원을 통해 어린이집 안전 강화

☐ 사업개요

- 어린이집 장기운영 격려금 지원(폐지 정리 지원금)
 - 관내 10년 이상 동일 대표자 또는 원장이 운영하는 어린이집이 정원 감소로 폐지 시
- 보육교직원 처우개선비 지급을 통한 급여 현실화
 - 명절수당, 정액급식비 등 대전광역시 처우개선 사업과 연계·지원 확대
- 안심보육 운영비 지원을 통한 안전 보육환경 조성
 - 어린이집 개소당 월 100,000원 지원
- 원활한 대체교사 지원으로 보육 서비스 품질 개선
 - 보육교직원 보수교육, 연가 등 보육 공백 발생 시 육아종합지원센터 대체교사 파견

☐ 연차별 로드맵

구 분		2022		2023				2024				2025				2026		임기후	
단위사업	세부추진	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	26년 하반기	27년 이후
장기운영 어린이집 격려	장기운영어린이집 격려금 지원																		
보육교직원 처우개선	보육교직원 처우개선비 확대 지급																		
안심보육 운영비 지급	안심보육운영비 지원																		
대체교사 지원 활성화	대체교사 파견																		

☐ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계 (총사업비)	임 기 내						임 기 후	확 보 액	집 행 액
		소계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.			
계	4,656	0	0	1,046	1,200	1,205	1,205	0	2,056	2,056
국 비	664	0	0	166	166	166	166	0	342	342
시 비	2,268	0	0	507	587	587	587	0	1,026	1,026
구 비	1,724	0	0	373	447	452	452	0	688	688
기타(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

☐ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비 고
장 기 운 영 격 려 금 지 급	건	목표	1	-	1	-	-	정상추진
		실적	1	-	1	-	-	
보육교직원 처우개선비 지원	건	목표	1	-	1	-	-	정상추진
		실적	1	-	1	-	-	
안심보육 운영비 지원	건	목표	1	-	1	-	-	정상추진
		실적	1	-	1	-	-	
대 체 교 사 용	건	목표	1	-	1	-	-	정상추진
		실적	1	-	1	-	-	

☐ 추진실적

그간 추진 실적	○ 대체교사 지원 활성화 - 대체교사 파견 사업 누적 1724명 지원, 654백만원 집행(~24년도 4분기) ○ 보육교직원 처우개선 - 보조교사 명절수당 355인, 35백만원 집행(~24년도 4분기) ○ 안심보육 운영비 지급 - 누적 106개소 지원, 219백만원 집행(~24년도 4분기) ○ 장기운영어린이집 격려금 지원 - 누적 4개소 7백만원 집행(~24년도 4분기)
이번 분기 추진 실적	○ 대체교사 지원 활성화 - 대체교사 파견 사업 234명 지원, 84백만원 집행(24년도 4분기) ○ 보육교직원 처우개선 - 보조교사 명절수당 11인, 1,100천원 집행(~24년도 4분기) ○ 안심보육 운영비 지급 - 89개소, 26백만원 집행(24년도 4분기)

대전광역시 대덕구

수신 대덕구육아종합지원센터장
(경유)

제목 2024년 11~12월 대체교사 지원(육아종합지원) 보조금 교부결정 및 지급통지

'영유아보육법' 제36조(보육의 보조 등) 및 지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률 제8조 규정에 따라, 2024년 11~12월 어린이집 대체교사 지원(육아종합지원) 보조금을 아래와 같이 교부결정 및 지급통지하오니 회계연도 예산에 반영을 기주시가 바랍니다.

1. 지급대상 : 대덕구육아종합지원센터

2. 지급액 : 금59,959,000원(금오천구백구십오만천원)

3. 지급내역

사 업 명	예산액	기금부탁	결정지급액	지급액 누계	잔 액
대체교사 지원 (육아종합지원) (금오)	359,400,000	299,444,000	59,959,000	359,400,000	0

4. 지급방법 : 계좌입금(계좌주: 대덕구육아종합지원센터, 예금은행: 734-930021-05405)

5. 예산삭제 : 2024년 12월 어린이집 인심보육운영비 보조금과 같은액 기수사가 반영됩니다.

대전광역시 대덕구

수신 대덕구청장
(경유)

제목 2024년 12월 어린이집 인심보육 운영비 지급 결의

'영유아보육법' 제36조(보육의 보조 등) 및 「대전광역시 대덕구 지방보조금 관리 조례」 제17조(교부결정)에 따라, 2024년 12월 어린이집 인심보육운영비 보조금을 아래와 같이 지급하고자 합니다.

1. 지급액 : 금8,600,000원(팔백육십만원)

2. 지급내역

사 업 명	예산액	기금부탁	결정지급액	지급액 누계	잔 액
어린이집인심보육운영비	18,800,000	99,750,000	8,600,000	115,350,000	13,550,000

3. 지급대상 : 결의어린이집 등 88개소 어린이집

4. 지급방법 : 어린이집별 계좌입금(결의)

5. 예산삭제 : 어린이집 운영-운영비 예산(예산회계시스템-예산지출내역관리(보조금)(307-8))

붙임 1. 2024년 12월 어린이집 인심보육 운영비 지급 검토보고 1부.

2. 2024년 12월 어린이집 인심보육 운영비 지급내역 1부, 결.

대전광역시 대덕구

수신 대덕구청장
(경유)

제목 2024년 시기전착수당(추석 명절수당) 보조금 지급결의

'영유아보육법' 제36조(보육의 보조 등) 및 「대전광역시 대덕구 지방보조금 관리 조례」 제17조(교부결정)에 따라, 2024년 어린이집 교직원 시기전착수당(추석 명절수당)을 아래와 같이 지급하고자 합니다.

1. 지급액 : 금81,700,000원(팔십일백만원)

2. 지급내역

사 업 명	예산액	기금부탁	결정지급액	지급액 누계	잔 액
시기전착수당	2,299,750,000	1,289,450,000	81,700,000	1,347,550,000	952,200,000

3. 지급대상 : 결의어린이집 등 88개소 어린이집

4. 지급내역 : 어린이집 교직원 시기전착 수당(명절수당)

5. 지급방법 : 포유교직원 개별 계좌입금(결의)

6. 예산삭제 : 보육예산 복지 증진-어린이집 운영-어린이집 교직원 시기전착(307-11)

붙임 1. 2024년 어린이집 교직원 시기전착수당(추석 명절수당) 지급내역 1부.

2. 2024년 시기전착수당(추석 명절수당) 보조금 지급 검토보고 1부.

3. 보조금 교부결정통지서 및 첨부문건 각 1부, 결.

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장

장우현

대덕구청장</

□ 향후 계획

○ 대전광역시·마음건강지원수당 단가 인상 추진 시 매칭 구비 확보

관리번호 4-9	다문화지원사업 신규 발굴 및 확충											
주관부서	가족친화과			여성친화팀장 장윤희 ☎ 608-6781				담당자 최유리 ☎ 608-6784				
사업구분					총사업비 (백만원)	이행도						이행율 (%)
완료시기	사업기간	사업주체 (국가/시/자체)	신규 여부	국책 사업		완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기	
임기 내	22년-계속	자체	기추 진	×	99		○					100
중앙정부 도움 필요성					해당 없음 (√) / 도움 필요 제도() 재정() 권한()							

□ 사업현황 및 정책목표

- 다문화 이주여성이 지역사회 공동체로써 능동적, 자립적인 일원으로서 역량을 확대할 수 있는 재능기부프로그램 지원
- 다문화가정의 자녀가 이중언어로 소통할 수 있는 환경을 조성하여 자녀의 정체성 확립 및 글로벌 인재로 성장을 지원

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 계속
- 사업내용

① 다이음사업(다문화 이주여성의 재능기부 프로그램)

- 다문화 이주여성 지원인력 및 대상 범위 확대 추진
 - 지원인력 : 다문화 이주여성 2명 → 6명(확대)
 - ※ 2024년부터 국비 다이음사업(2명) 일몰로 구비(100%) 지원(4명), 지역공동체 일자리사업(2명) 확보 운영
 - 대상 범위 : 어린이집, 지역아동센터 중심 → 유치원, 노인 관련시설(확대)
- 사업내용 : 다문화 이주여성들이 지역사회 다문화 활동가로 참여하여 지역 공동체를 찾아가는 다문화 친화 활동 추진
- 산출기초 : 강사료 10백만원(4명) + 자료제작비 2백만원 = 12백만원

② 다문화가정 자녀의 이중언어 말하기 대회

- 사업목적 : 다문화가족 자녀의 언어 재능을 조기에 발굴, 이중언어 의사소통 능력 향상
- 사업대상 : 관내 초·중·고 재학 중인 다문화 가정 학생
- 사업기간 : 2023년 ~ 계속
- 사업내용 : 한국어 및 부모 모국어 발표·심사·시상
- 소요예산 : 4백만원(구비 100%)

☐ 연차별 로드맵

구 분		2022		2023				2024				2025				2026		임기후	
단위사업	세부추진	1	2	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	26년 하반기	27년 이후
다문화지원사업	다이음사업																		
	이중언어말하기 대회																		

☐ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계 (총사업비)	임 기 내						임 기 후	확 보 액	집 행 액
		소계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.			
계	99	99	7	23	23	23	23	0	67	67
국 비	15	15	3	3	3	3	3	0	3	3
시 비	10	10	2	2	2	2	2	0	26	26
구 비	74	74	2	18	18	18	18	0	38	38
기타(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

☐ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비 고
다이음강사	명	목표	6	2	6	6	6	이행 후 계속추진
		실적	6	2	6	-	-	
대회개최	회	목표	1	-	1	1	1	이행 후 계속추진
		실적	1	-	1	-	-	

☐ 추진실적

그간 추진 실적	○ 2023 다이음 강사 : 6명 / 이중언어 말하기 대회 : '23. 11. 25.(토) / 1회 개최 ○ 2024년 가족센터 운영 국비보조금 확정내시 통보(구비_다이음사업포함) : '24.1.2. ○ 2024년 가족센터 운영 국비보조금 1차, 2차 교부(구비_다이음사업포함) : '24.1.31. ○ 다이음강사 모집(4명) 완료 및 활동 준비 : '24. 3. ※ 다이음강사 4명 채용 및 지역공동체일자리 사업(시비22백만원) 인력 2명 확보 ○ 2024년 가족센터 운영 국비보조금 1차, 2차 교부(구비_다이음사업포함) : '24. 5. 9. ○ 2024년 다문화가정자녀 이중언어말하기대회 보조금 교부 : 24. 10. 15.
이번 분기 추진 실적	○ 다이음강사 활동 : '24. 4 ~ 12. 완료 ○ 이중언어말하기대회 : '24. 11. 16. 개최 완료

		충청타임즈 2024년 11월 20일 (수) 지역 15
카드뉴스(홍보)	다이음 활동사진	이중언어말하기대회(보도자료)

☐ 문제점 및 대책

○ 해당 없음

☐ 향후 계획

○ 공약 사업 계속 추진

관리번호	동네병원과 함께하는 건강상담실 확대·운영
4-10	

주관부서	건강정책과	남부건강생활지원센터 팀장 김나영 ☎ 608-4471	담당자 노연희 ☎ 608-4468
------	-------	---------------------------------	--------------------


사 업 구 분					총사업비 (백만원)	이 행 도						이행율 (%)
완료시기	사업기간	사업주체 (국가/市/자체)	신규 여부	국책 사업		완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기	
임기내	23~26년	자체	×	×	237		○					100
중앙정부 도움 필요성					해당 없음 (√) / 도움 필요 제도() 재정() 권한()							

☐ 사업현황 및 정책목표

- 동네의원과의 협력을 통한 만성질환 예방 및 관리체계 구축
- 찾아가는 건강상담실 활성화를 통한 지역주민의 건강서비스 접근성 향상

☐ 사업개요

○ 사업내용



*일차의료 만성질환관리 시범사업: 동네의원을 중심으로 지역사회와 연계한 교육을 통해 스스로 만성질환을 관리하도록 돕는 서비스

☐ 연차별 로드맵

구분		2022		2023				2024				2025				2026		임기후	
단위사업	세부추진	1	2	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	26년 하반기	27년 이후
찾아가는 건강상담실	연중 운영																		
동네의원 협력 만성질환관리	연중 운영																		

☐ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계 (총사업비)	임 기 내						임 기 후	확 보 액	집 행 액
		소계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.			
계	237	237	42	45	50	50	50	0	99	99
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21
시 비	237	237	42	45	50	50	50	0	58	58
구 비	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20
기타(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비 고
건강상담 영역 별 영	영역	목표	4	-	4	-	-	이행 후 계속추진
		실적	8	-	4	4	-	

* 4개 영역 분기별 지속 추진: 통합(운동, 영양, 비만 등) / 정신건강 / 치매조기검진 및 상담 / 금연

□ 추진실적


그간 추진 실적	○ 생활터별 찾아가는 건강상담실 운영 : 33,353건 - 분야별 통합건강상담(운동, 영양, 비만 등) 및 교육 : 7,323건 - 금연교육 및 금연클리닉 운영 : 9,325건 - 이동 정신상담 및 모니터링 : 6,852건 - 치매상담 및 조기검진, 치매예방교육 : 9,162건 ○ 동네의원과 함께하는 만성질환관리 지원 : 4,360건 - 만성질환 관리를 위한 운동·영양 분야별 건강상담 및 교육 실시
이번 분기 추진 실적	○ 생활터별 찾아가는 건강상담실 운영 : 7,531건 - 분야별 통합건강상담(운동, 영양, 비만 등) 및 교육 : 5,791건 - 금연교육 및 금연클리닉 운영 : 573건 - 이동 정신상담 및 모니터링 : 325건 - 치매상담 및 조기검진, 치매예방교육 : 842건 ○ 동네의원과 함께하는 만성질환관리 지원 : 95건 - 만성질환 관리를 위한 운동·영양 분야별 건강상담 및 교육 실시



만성질환관리 근력강화 운동교육



맞춤형 영양상담 및 식사요법 교육



운동·영양관리 교육자료 제작 및 배포

□ 문제점 및 대책 : 해당없음

□ 향후 계획

- 지역의료기관과의 실무회의 추진 및 사업 활성화 방안 논의를 통한 업무 협력체계 강화
- 대상자 특성별 교육 내용 보완 및 자체 교육자료 제작, 대상자의 호응도를 반영한 체험형 건강상담실 운영으로 건강관리 흥미 유도

관리번호 4-11	경로당 어르신 건강관리 서비스
--------------	------------------

주관부서	건강정책과	건강증진팀장 김정례 ☎ 608-5471	담당자 김예진 ☎ 608-5467
------	-------	-----------------------	--------------------

사 업 구 분					총사업비 (백만원)	이 행 도						이행율 (%)
완료시기	사업기간	사업주체 (국가/市/자체)	신규 여부	국책 사업		완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기	
임기내	23~26년	자체	×	×	207		○					100
중앙정부 도움 필요성					해당 없음 (√) / 도움 필요 제도() 재정() 권한()							

☐ 사업현황 및 정책목표

- 어르신의 생활터인 경로당을 방문하여 건강관리 제공
- 동 중심 서비스 강화로 익숙한 환경에서 건강한 노년 생활 지원

☐ 사업개요

- 사업대상 : 관내 경로당(124개소) 이용 어르신(방문 요청 경로당)
- 사업내용
 - 경로당별 원스톱 건강관리 서비스 제공: 기초건강 측정 및 건강상담, 월별 건강관리 교육, 보건소 사업 안내, 의료기관 접근성 취약 경로당 집중관리
 - 찾아가는 보건복지서비스 연계를 통한 동별 사업화: 동 중심 건강관리 제공

☐ 연차별 로드맵

구분		2022		2023				2024				2025				2026		임기후	
단위사업	세부추진	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	26년 하반기	27년 이후
건강증진사업	조례 개정																		
	추진계획 수립																		
	경로당 건강관리																		
	보건·복지 자원연계																		

☐ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (총사업비)	임기내						임기후	확보액	집행액
		소계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.			
계	207	0	0	57	54.2	60	30	0	111.2	111.2
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
시비	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
구비	207	0	0	57	54.2	60	30	0	111.2	111.2
기타(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-

☐ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비 고
대덕구 지방공무원 정원 조례 일부개정	건	목표	1	1	-	-	-	완료
		실적	1	1	-	-	-	
세부계획 수립 및 운영	건	목표	1	-	1	-	-	이행 후 계속추진
		실적	1	-	1	-	-	

☐ 추진실적

그간 추진 실적	○ (2022년) 조례 개정 및 간호직 공무원 동 배치, 공약사업 추진계획 수립 - 경로당 건강관리 228건 3,970명 / 연계 290건 제공 ○ (2023년) 세부추진계획 수립 및 경로당 건강관리, 보건·복지 자원 연계 추진 - 경로당 건강관리 1,130건 18,966명 / 연계 2,350건 제공 - 의료기관 접근성 취약 경로당 건강강좌: 4회 ○ (2024년) 연간 세부추진계획 수립 및 경로당 건강관리, 보건·복지 자원 연계 추진 - (1분기) 경로당 건강관리 279건 5,093명 / 연계 114건 제공 - (2분기) 경로당 건강관리 306건 5,138명 / 연계 290건 제공 - (3분기) 경로당 건강관리 257건 3,277명 / 연계 70건 제공 - 의료기관 접근성 취약 경로당 건강강좌: 5회
이번 분기 추진 실적	○ 경로당 건강관리 309건 5,363명 / 연계 156건 제공 ○ 의료기관 접근성 취약 경로당 건강강좌 실시 1회



경로당 구급가방지원 전달식(23. 8.)



의료기관 접근성 취약
경로당 건강강좌



경로당 건강관리(건강교육)

☐ 향후 계획

- 경로당 어르신 대상 만성질환 관리 및 치매 예방사업 지속 추진
- 의료기관 접근성 취약 경로당 대상 건강강좌 추진
- 구급가방 내 물품 수량, 유효기간 확인, 재고 관리 및 사용방법 지도

관리번호 4-12	여성토탈케어센터 신설 · 운영											
주관부서	건강정책과		가정보건팀장 이희옥 ☎ 608-5481				담당자 최유진 ☎ 608-5482					
사업구분					총사업비 (백만원)	이행도						이행율 (%)
완료시기	사업기간	사업주체 (국가/시/자체)	신규 여부	국책 사업		완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기	
임기내	23~26년	자체	신규	×	257		○					100
중앙정부 도움 필요성					해당 없음 (√) / 도움 필요 제도() 재정() 권한()							

☐ 사업현황 및 정책목표

- 임신부터 육아까지 산모 중심의 다각적인 원스톱 서비스 지원
- 가정의 건강수준 향상 및 양육역량 강화

☐ 사업개요

- 대상: 가임기 · 갱년기 여성 및 임산부 · 영유아
- 내용: 산모 중심의 원스톱 서비스 제공 및 건강교육

☐ 연차별 로드맵

구 분		2022		2023				2024				2025				2026		임기후	
단위사업	세부추진	1	2	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	26년 하반기	27년 이후
가정보건사업	추진계획수립																		
	원스톱서비스지원																		
	타부서연계																		

☐ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계 (총사업비)	임 기 내						임 기 후	확 보 액	집 행 액
		소계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.			
계	257	257	0	71	60	62	64	0	22	22
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
구 비	257	257	0	71	60	62	64	0	22	22
기타(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비 고
임산부등록수	명	목표	2,100	-	600	600	600	300
		실적	1,405	-	652	753	-	-
서비스지원률	%	목표	53.3	-	50	53	55	57
		실적	59.6	-	51.1	59.6	-	-

□ 추진실적

그간 추진 실적	○ 2023년: 임산부등록수(누적) 652명, 서비스지원율(평균) 51.1% ○ 2024년 1~3분기: 임산부등록수(누적) 557명, 서비스지원율 57.5% ○ 산모 중심의 원스톱 서비스 지원 체계 구축 - 모자보건 및 여성어린이특화사업 연계 강화, 임신·출산 서비스 상담 지원
이번 분기 추진 실적	○ (2024. 4분기) 임산부등록수(누적) 753명, 서비스지원율* 59.6% *서비스 지원: 난임부부 지원, 산모신생아 건강관리 지원, 의료비 지원 등



임산부 건강교실 3기 운영(9~10월)



영유아 보호자 안전교육(10월)



임산부 배려 인식개선 캠페인



예비아빠 임산부 체험

□ 문제점 및 대책

- 사업비 중 신규 인력(시간선택제임기제) 인건비 미편성으로 부서 내 인력 재배치 등 기존인력을 활용한 임산부 건강관리 지원 체계 구축

□ 향후 계획

- 다양한 채널을 통한 사업 홍보로 임산부 등록관리 제고
- 산모 중심의 건강교육 및 임신·출산 건강서비스 연계 지속 추진

관리번호 5-1	회덕다목적체육센터 조성											
주관부서	문화관광체육과		체육시설팀장 홍현미 ☎ 608-6271		담당자 홍현미 ☎ 608-6271		담당자 박동성 ☎ 608-6273					
사업구분					총사업비 (백만원)	이행도						이행율 (%)
완료시기	사업기간	사업주체 (국가/시/자체)	신규 여부	국책 사업		완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기	
임기내	22~26년	자체	신규	×	7,200			○				50
중앙정부 도움 필요성					해당 없음 (√) / 도움 필요 제도() 재정() 권한()							

☐ 사업현황 및 정책목표

- 회덕다목적체육센터 건립 및 이용 활성화를 통한 지역주민 체력 증진 및 삶의 질 향상

☐ 사업개요

- 위 치 : 읍내동 517-12번지 일원
- 사업내용 : 전연령이 이용 가능한 회덕다목적체육센터 조성
- 규 모 : 부지 1,265㎡, 연면적 1,483.97㎡(지하1층~지상4층)
 - 2층 탁구장 / 3층 당구장, 체력단련실, 다목적실 / 4층 게이트볼장

☐ 연차별 로드맵

구 분		2022		2023				2024				2025				2026		임기후	
단위사업	세부추진	1	2	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	26년 하반기	27년 이후
회덕다목적 체육센터	투자심사 의뢰, 부담금 납부																		
	토지 사용허가 및 심의회 등 진행																		
	설계, 감리 용역																		
	공사 착공 및 준공																		

☐ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계 (총사업비)	임 기 내						임 기 후	확 보 액	집 행 액
		소계	2022	2023	2024	2025	2026. 2.			
계	3,800	3,800	1,500	2,300	0	0	0	0	6,212	1,637
국 비	2,500	2,500	1,500	1,000	0	0	0	0	700	100
시 비	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,312	535
구 비	300	300	0	300	0	0	0	0	4,200	1,184
기 금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 2.	비 고
센터 건립	%	목표	100	-	25	50	75	100
		실적	50	-	25	50	-	-

정상추진

□ 추진실적

그간 추진 실적	○ (2022. 11.) 지방재정 투자심사(자체) 및 공유재산심의회 의결 ○ (2023. 4.) 공공건축 사업계획 사전검토 및 공공건축심의 완료 ○ (2023. 7.) 기본 및 중간설계 완료 ○ (2023. 8.) 실시설계 용역 착수 ○ (2024. 1.) 총사업비 증액 검토(4,800백만원→72,00백만원) ○ (2024. 3.) 도시계획심의위원회 심의 ○ (2024. 5.) 개발제한구역 내 행위허가(신축) 협의완료 ○ (2024. 7.) 일상감사, 계약심사 완료 ○ (2024. 8.) 계약심의 및 BF(장애물 없는 생활환경) 예비인증 완료건설사업관리 용역 발주 ○ (2024. 9.) 건립공사 및 재해예방 기술지도 용역 계약의뢰
이번 분기 추진 실적	○ (2024. 10.) 시공사 및 건설사업관리용역 사업자 계약 ○ (2024. 11.) 착공

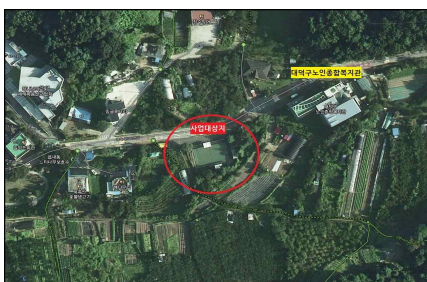

위치도



현장사진



조감도

□ 문제점 및 대책

- 사업비 부족분(1,000백만원) 시비(일반회계) 지원 지속 건의
- ※ 시비 미지원 시 25년도 추경 편성(구비) 예정

□ 향후 계획

- (2026. 2.) 준공

주관부서	문화관광체육과	체육시설팀장 홍현미 ☎ 608-6271	담당자 박동성 ☎ 608-6273
			담당자 고다영 ☎ 608-6272
			담당자 성지원 ☎ 608-6275

□ 사업현황 및 정책목표

- ## □ 사업개요

- ☐
- 연차별 로드맵

☐ 연도별 투자계획[illegible]

☐ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.
개보수 및 확충 건수	건	목표	24	5	7	5	7
		실적	106	44	41	21	-

☐ 추진실적


그간 추진 실적	○ 대덕국민체육센터 수영장 천장 보수 ○ 대청수상레포츠센터 인명구조선 수리 ○ 로하스야외수영장 상수도 배관 및 화장실 등 수리 ○ 금강로하스게이트볼장 시설 개보수(그늘막 설치) ○ 송촌생활체육공원 테니스장 시설개선공사 ○ 대덕국민체육센터 순환펌프 교체 및 남녀 샤워실 시설개선공사 ○ 대덕국민체육센터 노후 시설 개선 특교세 확보 등 ○ 송촌생활체육공원 게이트볼장 벤치 교체 및 펜스 개보수 ○ 대덕문화체육관 남자샤워실 개보수 ○ 덕암야구장 바닥 정비 ○ 로하스산호빛공원 야외수영장 배관 및 부대시설 개보수 ○ 대덕문화체육관 누수 상수도관 수리 ○ 대덕국민체육센터 노후시설 개선 공사 실시설계 용역 및 일상감사 ○ 로하스산호빛공원 야외수영장 부대시설 누수 및 맨홀 보수 ○ 석봉국민체육센터 시설 개보수 및 사인물 설치 ○ 중리근린공원국민체육센터 자동출입시스템 구입 계약의뢰
이번 분기 추진 실적	○ 송촌전천후 게이트볼장 누수 보수 ○ 덕암야구장 지하수 관정 부속 수리공사 ○ 대덕국민체육센터 수영장 전등 및 필름 보수



송촌전천후 게이트볼장 누수 보수



덕암야구장 지하수 관정 부속 수리



대덕국민체육센터 수영장 전등 및 필름 보수

☐ 문제점 및 대책

- 市 대전육교 관광사업, 동북부순환도로 노선 관련 길치공원 체육인프라 확충 지연
- 육교일원 공간디자인 내 체육시설 포함 협의 및 유희부지 설치 건의

☐ 향후 계획

- (2025년 연중) 노후시설 개보수

관리번호 5-3		대덕구 역사인물의 선양사업 강화										
주관부서		문화관광체육과		문화정책팀장 유진숙 ☎ 608-6571				담당자 노승민 ☎ 608-6574				
사업구분					총사업비 (백만원)	이행도						이행율 (%)
완료시기	사업기간	사업주체 (국가/시/자체)	신규 여부	국책 사업		완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기	
임기내	22~26년	자체	가결	×	520		○					100
중앙정부 도움 필요성					해당 없음 (√) / 도움 필요 제도() 재정() 권한()							

□ 사업현황 및 정책목표

- 지역의 역사 인물의 사상과 학문적 업적을 기리는 장 마련
- 지역 대표 문화제 개최로 전통문화 계승·발전 및 공동체 의식 함양

□ 사업개요

- 사업목적 : 지역의 역사 인물의 사상과 학문적 업적을 기리는 장 마련
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년 / 동춘당문화제(매년 4월중), 김호연재 (매년 9월중)
- 사업내용 : 지역 역사·문화·전통 축제 개최

□ 연차별 로드맵

구 분		2022		2023				2024				2025				2026		임기후	
단위사업	세부추진	1	2	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	26년 하반기	27년 이후
대덕구 역사인물 선양사업 강화	동춘당문화제	■			■				■				■				■		
	김호연재 여성문화축제		■			■				■				■					

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계 (총사업비)	임 기 내						임 기 후	확 보 액	집 행 액
		소계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.			
계	520	520	110	110	110	110	80	0	345	345
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시 비	130	130	26	26	26	26	26	0	78	78
구 비	390	390	84	84	84	84	54	0	267	267
기타(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

☐ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비 고
문 화 축 제 개 개 최	건	목표	9	2	2	2	1	이행 후 계속추진
		실적	6	2	2	-	-	

☐ 추진실적 (24. 12월말 현재)

그간 추진 실적	○ 제27회 동춘당문화제 개최('24. 4. 27.) - 80,000천원(시비 26,000 구비 54,000) 예산 중 79,962천원(99.9%) 집행 - 문정공시호봉송 및 동춘콘서트 등 동춘당의 사상과 업적을 기리는 문화축제 개최 ○ 제13회 김호연재 여성문화축제 개최('24. 9. 29.) - 45,000천원(구비 100%) 예산 전액 집행 - 김호연재 문화콘텐츠를 활용한 전시, 콘서트 등 다양한 문화 프로그램 운영
이번 분기 추진 실적	○ 제28회 동춘당문화제 및 제14회 김호연재 여성문화축제 예산확보 - 제28회 동춘당문화제 : 총 예산 80,000천원(시비 24,000) 예산확보 - 제14회 김호연재 여성문화축제 : 총 예산 45,000천원(전액 구비) 예산확보



제26회 동춘당문화제 - 송모제례



제27회 동춘당문화제 - 동춘콘서트



제13회 김호연재 여성문화축제

☐ 문제점 및 대책

- 홍보와 관련하여 SNS로 홍보할 수 있는 보다 다양한 콘텐츠 및 채널 확보
- 행사 인력 부족과 관련하여 자원봉사자 등 행사지원 인력 적극 모집

☐ 향후 계획

- 역사인물의 사상과 학문적 업적을 기리기 위한 대표프로그램 개발
- 역사인물과 관련된 전통 문화유산을 홍보할 수 있는 차별화된 체험부스 운영


사 업 구 분					총사업비 (백만원)	이 행 도						이행율 (%)
완료시기	사업기간	사업주체 (국가/市/자체)	신규 여부	국책 사업		완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기	
임기내	22~26년	자체	신규	×	8	○						100
중앙정부 도움 필요성					해당 없음 (√) / 도움 필요 제도() 재정() 권한()							

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비 고
D B 구 축	식	목표	1	-	1	-	-	완료
		실적	1	-	1	-	-	

□ 추진실적

그간 추진 실적	○ 대덕구 명소 DB 구축 완료 - 대덕구 명소 DB구축 계획 및 촬영명소 로케이션 발굴 추진계획 수립 - 촬영 장소 선정 및 명소 촬영(35개소) 완료 - 홍보물(USB, 엽서 등) 제작 및 전국 영화사 등 190개소 대상 발송
이번 분기 추진 실적	○ 대덕구 명소 DB 관리 및 홍보 - 대덕구 관광홈페이지 內 ‘대덕구 명소’ 메뉴 지속 관리 - 명소DB QR코드를 활용한 관광안내책자 제작

	구는 최근 '2024 대덕구 관광활성화 육성계획'을 수립했다. 주요 내용은 기존 사업의 성과, 기대효과 등을 전면 재검토해 육성 방향을 재편하고, 핵심 공약 사업에 집중하는 게 골자다. 초점은 최종구 구청장의 최우선 공약인 '새마을 물길 30리 프로젝트'에 맞췄다. 금강하류점에서 대청댐까지 구간을 대상으로 친환경 수변공원 조성, 수상레포츠 활성화, 조정단지 조성 등을 추진한다. 구는 수변데크, 전망대 사업 등을 위해 적극적으로 공모사업에 뛰어들었고, 최근 50억 원 규모의 국비 확보에 성공했다. 최신 트렌드로 자리잡은 '대덕에서 일주일 살기' 사업도 확대한다. 또 자율형 관광 흐름을 감안해 모바일 스탬프투어 사업도 기존대로 유지하기로 결정했다. 영화, 드라마 촬영지 홍보를 위한 대덕구 명소 데이터베이스(DB) 구축 사업도 지속한다. 대청호, 계족산 등 주요 관광명소와 길목길, 폐공장 등 로케이션 장소를 선제적으로 발굴·홍보하겠다는 구상이다. 다만, 대덕관광벨트, 관광두레 프로그램 등 일부 소규모 사업은 올해 협약 만료 일정에 맞춰 일몰사업으로 전환, 지속하지 않기로 결정했다.	
영상미를 갖춘 촬영장소	디트뉴스 2024년 관광활성화 계획 中 '대덕구 명소 데이터베이스(DB)구축'	2024년 대덕구 관광안내책자 중 DB 큐알 코드 탑재

□ 향후 계획

- 각종 행사 연계 활용 및 관련 부서(사업소 등) 홍보 협조
- 대덕구 명소DB의 효과적인 홍보를 위한 다각적 방안 모색

관리번호 5-5		대덕시티투어 프로그램 운영										
주관부서		문화관광체육과			관광축제팀장 김정하 ☎ 608-6731				담당자 조현주 ☎ 608-6733			
사업구분					총사업비 (백만원)	이행도					이행율 (%)	
완료시기	사업기간	사업주체 (국가/市/자체)	신규 여부	국책 사업		완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	보류		폐기
임기내	22~26년	자체	신규	×	320	○					100	
중앙정부 도움 필요성					해당 없음 (√) / 도움 필요 제도() 재정() 권한()							

□ 사업현황 및 정책목표

- 관광코스의 다변화로 대덕구를 다양한 주제로 여행할 수 있는 기회를 관광객에게 제공하고, 과거·현재 그리고 미래를 관통하는 관광상품 활성화

□ 사업개요

- (사업기간) 2023년 ~ 2026년
- (사업내용) 투어 버스 임차(래핑 등) 및 대덕구 전담 해설사 통한 정기테마 투어 버스 및 축제 연계한 시즌 투어 운영
 - (주요코스) 2개 코스(생태, 역사), 월 2~3회 운영 / 혹서·혹한기 제외

□ 연차별 로드맵

[illegible]☐ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

[illegible]

□ **공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표·실적		2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비 고
투어 프로그램 개 발 · 운 영	식	목표	1	-	1	-	-	-	이행 후 계속추진
		실적	2	-	1	1	-	-	

☐ 추진실적

기간 추진 실적	○ 2023 대덕시티투어「대덕 고래(Go來)여행」추진 - (운영일정) 2023년 4월 ~ 10월 - (운영코스) 1개 코스(대청호-계족산-신탄진 오일장) / 10회 진행 - (참가인원) 총 243명 / 1회당 평균 24명 참여						
이번 분기 추진 실적	○ 2024 대덕시티투어「대덕 고래(Go來)여행」추진 완료 - (운영일정) 2024년 4월 ~ 10월 - (운영코스) 2개 코스 / 15회 진행 (생태 8, 역사 7) <table> <tr> <th>코스명</th><th>주요 코스</th></tr> <tr> <td>1코스(생태힐링)</td><td>대청호-계족산-신탄진 오일장</td></tr> <tr> <td>2코스(역사힐링)</td><td>송애당, 동춘당 등(중리동, 송촌동)-비래사-오정동 선교사촌</td></tr> </table> - (참가인원) 총 346명 / 1회당 평균 24명 참여 - (홍보실적) 팸투어 진행, TV(대전MBC) 방영, 언론(동아일보) 게재 등	코스명	주요 코스	1코스(생태힐링)	대청호-계족산-신탄진 오일장	2코스(역사힐링)	송애당, 동춘당 등(중리동, 송촌동)-비래사-오정동 선교사촌
코스명	주요 코스						
1코스(생태힐링)	대청호-계족산-신탄진 오일장						
2코스(역사힐링)	송애당, 동춘당 등(중리동, 송촌동)-비래사-오정동 선교사촌						



대덕고래여행 단체사진



대전MBC 방송촬영



동아일보 보도자료

□ 향후 계획

- 원활한 투어 진행을 위해 지속 점검 및 추진
- 2024년도 사업 결과를 바탕으로 세부사항 보완 및 홍보 확대

[illegible]

☐ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비 고
연 도 별 재 조 성	개소	목표	8	-	-	3	3	2
		실적	3	-	-	3	-	-

☐ 추진실적 (24. 12월말 현재)

그간 추진 실적	○ 계족산 자연휴양림 조성 - '23. 2.: 기본계획 및 실시설계 용역 착수 - '23. 4.: 기본계획 및 실시설계 용역 착수보고회 개최 - '23. 12. ~ '24. 3.: 조성계획 승인 등 각종 인허가 추진 ○ 장동문화공원 조성 - 장동 도시생태축 복원사업 추진 / 완료 - 장동 생활공원 조성사업 추진 / 완료 - 장동문화공원 주차장 조성사업 착공(235면) / 완료 ○ 계족산 시민공원 임도 신설 0.5km(8.12.~12.30.) / 문화재 시굴 완료
이번 분기 추진 실적	○ 계족산 시민공원 임도 신설사업 공정률 100%

☐ 문제점 및 대책

- 계족산 자연휴양림 24년 본예산 미확보로 사업추진 일정 지연 우려
⇒ 토지보상비 등 사업비 확보하여 공약사업이 원활히 진행될 수 있도록 市와 지속적 협의

☐ 향후 계획

- 2026. : 계족산 자연휴양림 조성 완료

[illegible]

☐ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비 고
연 도 별 사업추진	개소	목표	3	-	-	1	1	1
		실적	1	-	-	1	-	-

☐ 추진실적

그간 추진 실적	○ 이 행 도 : 정상추진(0%) ○ 2023년 추진 - 23년 3월 기본계획 수립 및 기본설계용역 발주완료, 꽃단지 사업추진 - 2023. 5. : 새여울물길30리프로젝트 기본설계용역 착수 - 2023. 6. : 생태탐방로 조성 실시설계용역 추진 / 도시계획과 - 2023. 9. : '24년 G.B주민지원사업 공모 선정(25억원 확보) / 도시계획과 - 2023. 9. ~ 10. : 대규모 꽃정원(대청호공원) 조성 - 2023. 10. : 자전거단절구간 연결 및 시설개선사업 추진 / 건설과 - 새여울물길 30리 프로젝트 기본설계 용역 완료 ○ 2024년 새여울물길30리 꽃정원 조성사업 추진 - 기 간: 2024. 4. 24. ~ 6. 22. / 60일간 - 위 차: 미호동 67 (대청공원 일원) - 내 용: 새여울물길 프로젝트와 연계한 관광단지 꽃정원 조성 수국 5종 4,000여주, 계절꽃(물망초, 코스모스) 식재 등 - 사 업 비: 62,660천원(도급 20,724, 관급 41,936) - 추진사항: (5.30.) 준공 및 준공검사 ○ 2024. 9. : 생태탐방로 조성 실시설계 추진 L=3.8km / 도시계획과 ○ 2024. 9. : 대청호 자전거길 단절구간 연결 및 개선사업 0.9km / 건설과 ○ 2024. 9. : 공모사업 및 국시비 교부사업 응모 등 추진 중 / 공원녹지과
이번 분기 추진 실적	○ 2025년 사업추진 준비

☐ 문제점 및 대책

- 장마철 집중호우로 인한 하천 내 시설물 설치를 위한 관계기관 협의 지난
- 관련기관은 하천의 적극적인 이용보다는 소극적 하천 기능관리가 기조임
☞ 하천법 제33조(하천의 점용허가 등) 및 G·B법 제12조(개발제한구역에서의 행위제한)

☐ 향후 계획

- 새여울물길 30리 프로젝트 기본설계서에 따른 관련부서 유관사업 추진
- 내년 국시비 보조에 따른 도시숲 등 관련사업 확보 및 도급사업 추진

관리번호	걸어서 만나는, 권역형 어린이공원 조성									
5-8										

주관부서	공원녹지과	공원조성팀장 노윤주 ☎ 608-5111	담당자 김희연 ☎ 608-5113
------	-------	-----------------------	--------------------

사 업 구 분					총사업비 (백만원)	이 행 도						이행율 (%)
완료시기	사업기간	사업주체 (국가/市/자체)	신규 여부	국책 사업		완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기	
임기후	23~29년	자체	가결	×	5,600		○					63
중앙정부 도움 필요성					해당 없음 (√) / 도움 필요 제도() 재정() 권한()							

☐ 사업현황 및 정책목표

○ 어린이 놀이공간 확충 및 시설물 안전·방역 강화를 통한 어린이 놀이환경 개선

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2029.
- 사업내용 : 어린이공원 재조성 8개소 / 지역여건, 이용형태, 노후정도 등 고려
- 정비방향 : 정비개념 변화(도시재생 공원 클러스터화), 차별화된 맞춤형 공원시설

☐ 연차별 로드맵

구분		2022		2023				2024				2025				2026		임기후	
단위사업	세부추진	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	26년 하반기	27년 이후
어린이공원 재조성	실시설계용역 및 행정절차																		
	본공사 추진 및 완료																		

☐ 연도별 투자계획

구분		합계 (총사업비)	임기내					임기후	확보액	집행액
			소계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.		
계	5,600	3,680	0	920	920	920	920	1,920	2,200	2,134
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시비	2,856	1,876	0	469	469	469	469	980	1260	1238
구비	2,744	1,804	0	451	451	451	451	940	940	896
기타(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(단위 : 백만원)

☐ **공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표·실적		2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비 고
연 도 별 재 조 성	개소	목표	8	-	2	2	2	2	정상추진
		실적	5	-	4	1	-	-	

☐ **추진실적**

그간 추진 실적	○ 2023년 새말, 통매바위, 다정, 여태말어린이공원 재조성사업 완료 ○ 2024년 증척골어린이공원 재조성사업 완료
이번 분기 추진 실적	○ 준공 및 공사완료 공고 등 ○ 2025년 사업추진 준비



조성전



조성후

☐ **향후 계획**

- '25. 1. ~ 4. : 도시관리계획 결정(변경) 및 실시설계 용역 추진
- '25. 4. ~ 5. : 행정절차 추진
- '25. 5. ~ 10. : 공사 추진

[illegible]

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비 고
루미나리에	식	목표	3	-	1	1	1	이행 후 계속추진
		실적	2	-	1	1	-	
노후시설 및 편의시설 정비	식	목표	4	1	1	1	1	이행 후 계속추진
		실적	3	1	1	1	-	

□ 추진실적

그간 추진 실적	○ 2023년 길치문화공원 정비 - 사업기간 : 23. 5. 16. ~ 7. 4. - 사 업 비 : 81백만원 - 사업내용 : 목재계단 정비, 투수블럭포장 등 노후시설물 정비 ○ 도시공원 야간 경관조명 설치사업 추진 - 사업기간 : 23. 12. 5. ~ 12. 26. - 사 업 비 : 93백만원 - 사업내용 : LED야간 경관조명 267조 설치 ○ 대전육교 일원 관광자원화 공간디자인 용역(市 관광진흥과) - 사업기간 : 23. 11. ~ 24. 5.(6개월간) - 사 업 비 : 19백만원 - 사업내용 : 대전육교 활용 창의적 디자인 창출로 관광자원화 방안 마련 ○ 2024년 길치문화공원 정비 - 사업기간 : 24. 6. 12. ~ 6. 26. - 사 업 비 : 92백만원 - 사업내용 : 데크웬스 및 배수로 설치, 수목 식재 등
이번 분기 추진 실적	○ 야간 경관조명 운영 (24. 11.~ 25. 2.)

		
길치문화공원 위치도	길치문화공원 정비사업 준공계	야간 경관조명 설치운영 (길치 외1)

□ 향후 계획

- 2024. 7. ~ 2025. 2. : 도시공원 야간경관 조명 설치 운영

사 업 구 분					총사업비 (백만원)	이 행 도						이행율 (%)
완료시기	사업기간	사업주체 (국가/市/자체)	신규 여부	국책 사업		완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기	
임기내	22~계속	자체	가궤진	×	792		○					100
중앙정부 도움 필요성					해당 없음 (√) / 도움 필요 제도() 재정() 권한()							

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비 고
배달강좌 학습자	명	목표	1,650	250	350	350	350	이행 후 계속추진
		실적	3,532	261	1,729	1,542	-	
동아리	팀	목표	116	18	20	23	26	이행 후 계속추진
		실적	62	18	21	23	-	
플랫폼구축	회	목표	1	0	1	0	0	이행완료
		실적	1	0	1	0	0	
참여자육성	회	목표	4	0	1	1	1	이행 후 계속추진
		실적	16	0	1	15	-	
활동가교육	회	목표	4	0	1	1	1	이행 후 계속추진
		실적	31	0	1	30	-	
성과공유	회	목표	24	0	5	5	7	이행 후 계속추진
		실적	17	0	5	12	-	
홍보	건	목표	60	12	12	12	12	이행 후 계속추진
		실적	36	12	12	12	-	

□ 추진실적

그간 추진 실적	○ 배달강좌 : 447강좌 2,882명 참여 ○ 평생학습원 동아리 운영 : 23개팀 ○ 리더양성교육(9강좌 299명)마을미디어 활성화 교육(14강좌 680명) ○ 지역 내 공동체 참여기회 및 활성화를 위한 홍보 - SNS, 홈페이지 등을 통한 프로그램 참여 안내(월1회/총33회)
이번 분기 추진 실적	○ 배달강좌 : 58개 강좌 540명 참여 ○ 평생학습원 동아리 운영 : 23개팀 ○ 리더양성교육(6강좌 197명)마을미디어 활성화 교육(16강좌 359명) ○ 성과공유(12개동 마을축제)를 통해 문화예술 활성화 공유의 장 마련 ○ 지역 내 공동체 참여기회 및 활성화를 위한 홍보(월1회/총3회)



배달강좌 운영(댄스스포츠)



평생학습원 동아리



미디어 활성화 교육

□ 향후 계획

- 배달강좌 운영, 도서관 동아리 지원 등 구민의 문화예술 참여기회 제공을 위한 프로그램 운영과 지속적인 홍보
- 공동체 참여자 육성(교육) 및 성과 공유를 통한 문화예술 활성화

관리번호 5-11	공공도서관 신규 조성									
주관부서	평생학습과	시설팀장 김종범	☎ 608-5581	담당자 김종범	☎ 608-5581	담당자 김진구	☎ 608-5585			

사 업 구 분					총사업비 (백만원)	이 행 도						이행율 (%)
완료시기	사업기간	사업주체 (국가/市/자체)	신규 여부	국책 사업		완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기	
임기 후	23~27년	자체	×	×	21,418			○				50
중앙정부 도움 필요성					해당 없음 () / 도움 필요 제도() 재정(√) 권한()							

□ 사업현황 및 정책목표

- 동별 도서관 설치로 지역민의 지식정보 접근 편리성 제공
- 평등한 정보 기회를 제공하고 공동체 중심의 주민밀착형 공간 조성

□ 사업개요

- 사업기간: 2023년 ~ 2027년
- 사업내용: 동별 행정복지업무와 도서관·문화업무 복합기능의 공공도서관 확보

연차별 로드맵

[illegible]

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

[illegible]

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적		2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비 고
동 별 착수율	%	목표	100	-	-	50	25	25	정상추진
		실적	50	-	-	50	-	-	

□ 추진실적

그간 추진 실적	○ 「대덕구 공공도서관 중장기 발전계획 수립」 용역 완료 / 23. 12. 22. ○ 「대전 대표도서관 건립」 부지 오정동 일원 확정(유치) / 24. 04. 01. ○ 덕암동 새일복합문화센터 건립 사업추진 MOU체결 / 24. 7. 8.(區↔교육청) ○ 덕암동 새일복합문화센터 건립 사업 학교복합시설 공모 신청 / 24. 07. 12. ○ 「새일복합문화센터 건립 사업」 공모 선정 / 24. 08. 08.(교육부)
	○ 제12회 시구협력회의 안건으로 새일복합문화센터 건립사업비 지원 건의 - 총 250억 중 구비 부담분 75억 원 중 50% 지원 건의 / 24. 11. 29. (區→市) ○ 새일복합문화센터 건립 사업 구상(안) 설계 용역 추진 / 2024. 12. 05. ○ 2024년 하반기 학교복합시설 워크숍 및 실무협의회 참석 / 2024. 12. 09. ○ 「2024년 공립공공도서관 설립 타당성 사전평가」 통과 / 2024. 12. 20. ○ 대화동 꿈그린작은도서관 준공 및 개관 / 2024. 12. 20.

 대전광역시청에서 열린 새일복합문화센터 건립사업비 지원 건의 회의	 새일복합문화센터 건립 사업 국비 확보 (공모 사업 선정)	문화체육관광부 수신·수신자 참조 (경유) 제목: 「2024년 하반기 공립공공도서관 설립타당성 사전평가」 최종결과 통지(대전) 1. 관련 근거 가. 도서관법 제31조 및 도서관법 시행령 제28조 나. 문화체육관광부 도서관정책기획단-5285(2024. 10. 18.) 다. 대덕구 평생학습원 평생학습과-5432(2024. 12. 18.), 대전광역시 교육도서관과-4059(2024. 12. 19.) 2. 「2024년 하반기 공립공공도서관 설립타당성 사전평가」 초견부 적정 평가 관련에 대하여 최종결과를 다음과 같이 알려드립니다. □ 최종결과 <table border="1"> <thead> <tr> <th>시군구</th><th>사업명</th><th>최종결과</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>대전 대덕구</td><td>새일복합문화센터(새일도서관) 건립</td><td>적정</td></tr> </tbody> </table> 공립공공도서관 설립타당성 사전평가 결과 적정 (공문 2024. 12. 20.)	시군구	사업명	최종결과	대전 대덕구	새일복합문화센터(새일도서관) 건립	적정
시군구	사업명	최종결과						
대전 대덕구	새일복합문화센터(새일도서관) 건립	적정						

□ 향후 계획

- 「새일복합문화센터 건립 사업」 2025년도 제1차 지방재정 투자심사 의뢰
- 2025. 01. 15.까지 의뢰 / 2월 실무 심사 / 3월 중 결정 및 통보
- 새일복합문화센터 건립사업비(총 250억) 중 구비 부담분 75억 원 중 50% 지원 건의
- 제12회 시구협력회의에 건의를 통해 사업비 확보 추진 / 3월 개최 예정

[illegible]

□ **공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표·실적		2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비 고
도서관 구축 추진율	%	목표	100	-	30	70	-	-	완료
		실적	100	-	30	70	-	-	

☐ 추진실적

그간 추진 실적	○ (2023.02.27.) 전문가 자문(한남대 문헌정보학과 교수 2인)
	○ (2023.03.29.) 대덕구 메타버스 도서관 구축계획 결재 및 재검토 보고
	○ (2023.04.12.) 메타버스 도서관 2차 재검토 보고 / 사업전면 보류
	○ (2023.5.22.~6.22) 메타버스 VR 파노라마 도서관 구축 검토 / 대안사업
	○ (2023.06.22.) 관련부서 회의(도서관운영과, 기획홍보실, 정책보좌관 등)
	○ (2023.07.28.) 「메타버스 도서관」 구축 대안 사업 계획(안) 결재
	○ (2023.08.03.) 「민선8기 공약사업 실천계획」 조정요청서 제출
	○ (2023.10.24.) 「민선8기 공약사업 주민평가단 회의」
	○ (2023.11.01.) 「공약사업주민평가단 심의의결」 / 실천계획변경 확정
	○ (2024.02.20.) 인공지능(AI) 도서관[창작실] 2개소 조성(신탄진도서관)
이번 분기 추진 실적	○ 인공지능(AI) 도서관[창작실] 운영

☐ 향후 계획

- 도서관 이용자에게 인공지능을 활용한 콘텐츠 제작 및 공유공간 지원 지속

관리번호 5-13	어린이 맞춤 특성화 프로그램 운영										
주관부서	도서관운영과				석봉도서관장 최정윤 ☎ 608-6281				담당자 박초록 ☎ 608-6288		
사업구분					총사업비 (백만원)	이행도					이행율 (%)
완료시기	사업기간	사업주체 (국가/시장/자체)	신규 여부	국책 사업		완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	보류	
임기내	22~26년	자체	가궤진	×	101		○				100
중앙정부 도움 필요성					해당 없음 (√) / 도움 필요 제도() 재정() 권한()						

□ 사업현황 및 정책목표

- 아이들의 정서적인 안정감 및 자존감 형성을 위한 독서·문화공연 제공
- 아동의 적절한 여가 권리를 보장하여 행복감 충족 및 삶의 질 향상

□ 사업개요

- 대 상 : 유아~어린이(13세 미만)
- 운영기관 : 석봉·안산·송촌도서관
- 주요내용 : 유아·어린이 대상 독서문화프로그램, 문화예술 공연 등 운영

□ 연차별 로드맵

[illegible]

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

[illegible]

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적		2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비 고
확인지표명	건	목표	450	100	100	100	100	50	정상추진
		실적	470	126	237	107	-	-	

□ 추진실적

그간 추진 실적	○ 작가와의 만남(특강포함) 11회 392명 참여 ○ 도서관견학프로그램 156회 2,704명 참여 ○ 어린이맞춤프로그램 111회 1,024명 참여 ○ 어린이문화공연 16회 1,879명 참여 ○ 북스타트 책놀이 15회 279명 참여 ○ 찾아가는 책놀이 10회 55명 ○ 방학중프로그램 121회 1,199명 참여 ○ 버스킹 2회 438명 참여
이번 분기 추진 실적	○ 도서관견학프로그램 12회 255명 참여 ○ 어린이맞춤프로그램 14회 116명 참여 ○ 어린이문화공연 2회 188명 참여



어린이 문화공연



도서관 견학프로그램



어린이맞춤프로그램

□ 향후 계획

- 방학중 프로그램 운영(석봉·송촌도서관, 1월)
- 도서관견학프로그램 운영(석봉·안산·송촌도서관, 3월)

☐ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계 (총사업비)	임 기 내						임 기 후	확 보 액	집 행 액
		소계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.			
계	52	52	0	13	13	13	13	0	4	1
국 비	0	0	0	0	0	0	0		0	0
시 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
구 비	52	52	0	13	13	13	13	0	4	1
기타(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

☐ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적		2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비 고
근거규정 수립	건수	목표	1	1	-	-	-	-	완료
		실적	1	-	1	-	-	-	
계획수립	건수	목표	1	1	-	-	-	-	완료
		실적	1	-	1	-	-	-	
명예구청장 운영	회	목표	3	-	1	2	-	-	이행 후 계속추진
		실적	3	-	1	2	-	-	

☐ 추진실적

그간 추진 실적	○ 민선8기 공약사업 명예구청장제도 운영 추진계획 수립(자치행정과-7703호) ○ 명예구청장협의회 운영 규칙 제정(2023. 9. 15. 공포) ○ 민선8기 공약사업 명예구청장협의회 선발 및 운영계획 수립(자치행정과-14263호) ○ 민선8기 공약사업 명예구청장협의회 위촉계획 수립(자치행정과-1084호) ○ 명예구청장협의회 위촉 및 1분기 회의(2024. 2. 6.) ○ 구청장 현장행정 동행(2024. 5. 29.) ○ 명예구청장협의회 오찬간담회(2024. 8. 27.) / 활성화 방안 논의 ○ 명예구청장제도 활성화 추진 계획 수립(자치행정과-12517, 2024. 9. 12.) ○ 명예구청장-동장 간담회(2024. 9. 23.) / 상견례, 지역발전 및 협력방안 모색
이번 분기 추진 실적	○ 명예구청장협의회 2024. 4분기 정기회의(2024. 10. 8.) ○ 명예구청장 민생 안정 간담회(2024. 12. 23.) / 민생 안정 대책 논의



□ 향후 계획

- 제1대 명예구청장협의회 명예구청장 재위촉 / 2025. 1월
- 명예구청장협의회 2025. 1분기 정기회의 / 2025. 2월


사 업 구 분					총사업비 (백만원)	이 행 도						이행율 (%)
완료시기	사업기간	사업주체 (국가/市/자체)	신규 여부	국책 사업		완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기	
임기내	22~26년	자체	가추진	×	5,030		○					100
중앙정부 도움 필요성					해당 없음 () / 도움 필요 제도() 재정(√) 권한()							

☐ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비 고
신규설치	대	목표	100	20	20	20	20	이행 후 계속추진
		실적	116	39	77	101		
성능개선	대	목표	150	30	30	30	30	이행 후 계속추진
		실적	221	126	95	65		

☐ 추진실적

그간 추진 실적	○ 2022년 방법용 CCTV 설치공사 - 주택가, 우범지역 등 150개소 165대 설치 완료 - 사업비: 1,099백만원(국300, 시583, 구216) 집행완료
	○ 2023년 방법용 CCTV 설치공사 - 주택가, 우범지역 등 149개소 172대 설치 완료 - 사업비: 1,411백만원(국679, 시512, 구220) 집행완료
	○ 2024년 방법용 CCTV 설치공사 - 주택가, 우범지역 등 89개소 166대 설치 완료 - 사업비: 1,131백만원(국900, 구330) 집행완료
이번 분기 추진 실적	○ 방법용 CCTV 추가설치공사 - 방법용 CCTV 신규설치 4개소 8대

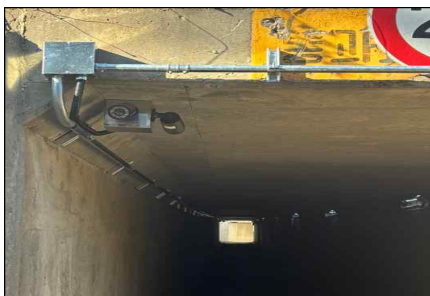

<방법용 CCTV 신규설치>



<방법용 CCTV 성능개선>



<지능형 CCTV 설치>

☐ 문제점 및 대책

- 국민신문고·경찰협업 등 방법용 CCTV 설치요청 수요는 증가 추세이나 대량의 시설물 유지관리를 할 수 있는 전문운영인력의 한계 발생으로 통신분야 고유업무의 원활한 수행을 위한 방송통신직 인력충원 필요

☐ 향후 계획

- (2025. 1. ~ 12.) 특별교부세 및 특별조정교부금 예산 확보 건의
