



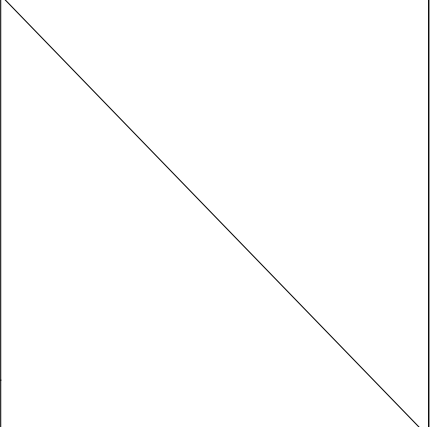


**공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비고
공영주차장 조성	개소	목표	1	-	-	-	1	정상추진
		실적	-	-	-	-	-	

**추진실적**

<p><b>그간 추진 실적</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 타당성 조사용역 착수('23.02.24.)</li> <li>○ 관련기관 업무협의/국가철도공단('23.05.19.-07.27.)</li> <li>○ 2024년 주차환경개선지원사업 신청서 제출('23.07.27.) / 미선정</li> <li>○ 타당성 조사용역 준공('23.10.20.)</li> <li>○ 區 투자심사 결과 통보(원안의결)('23.11.06.)</li> <li>○ 도시관리계획 결정 및 실시설계용역 착수('24.03.05.)</li> <li>○ 도시관리계획 결정 및 실시설계용역 선금(80백만원) 집행('24.03.28.)</li> </ul>
<p><b>이번 분기 추진 실적</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도시관리계획 결정(변경) 입안 요청('24.03.05.) / 교통과→도시계획과</li> <li>○ 2025년 주차환경개선지원사업 신청서 제출('24.06.26.) / 區→市</li> </ul>

		
<p>도시관리계획 결정(변경) 입안 요청</p>	<p>2025년 주차환경개선지원사업 신청서 제출</p>	

**문제점 및 대책**

- 2024년 주차환경개선지원사업 미선정에 따른 사업비 미확보  
⇒ 2025년 주차환경개선지원사업 선정에 따른 결과 반영 예정

**향후 계획**

- '24. 07. ~ '24. 12. : 행정절차(도시계획시설결정, 보상협의 등) 추진
- '25. 01. ~ '26. 12. : 공사 추진
