

관리번호	계족산 시민공원 프로젝트 추진				
5-6					

주관부서	공원녹지과	녹지팀장 박천규 ☎ 608-5121	담당자 박천규 ☎ 608-5121
------	-------	---------------------	--------------------

사업구분					총사업비 (백만원)	이행도						이행율 (%)
완료시기	사업기간	사업주체 (국가/시/자체)	신규 여부	국책 사업		완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기	
임기 내	23~26년	市-구	신규	×	29,141			○				38
중앙정부 도움 필요성					해당 없음 (○) / 도움 필요 제도() 재정() 권한() √ 표시							

사업현황 및 정책목표

- 천혜의 산림자원인 장동 계족산 일원을 시민 휴식공원으로 조성하여 다양한 휴양 콘텐츠 도입으로 휴양여건을 제고하고 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 6.
- 사업내용 : 자연생태 복원에 따른 즐거운 일상을 위한 휴양시설 확충

연차별 로드맵

구분		2022		2023				2024				2025				2026		임기후		
단위사업	세부추진	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	26년 하반기	27년 이후	
계족산 시민공원 프로젝트	市 협의 및 행정절차 이행		■			■	■													
	사업별 예산확보 (국시비 및 공모)		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
	실시설계용역 도급사업 추진 등			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (총사업비)	임기내						임기후	확보액 (예산편성액)	집행액
		소계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.			
계	13,800	13,800	0	3,450	3,450	3,450	3,450	0	10,875	10,654
국비	6,200	6,200	0	1,550	1,550	1,550	1,550	0	5,164	5,009
시비	6,200	6,200	0	1,550	1,550	1,550	1,550	0	5,662	5,642
구비	1,400	1,400	0	350	350	350	350	0	49	3
기타(민자)	0	0	0	0	0	0	0	0		

※ 계족산 시민공원 조성사업 중 市에서 직접 추진하는 사업(휴양림, 문화공원) 예산 확보액 및 집행액 반영

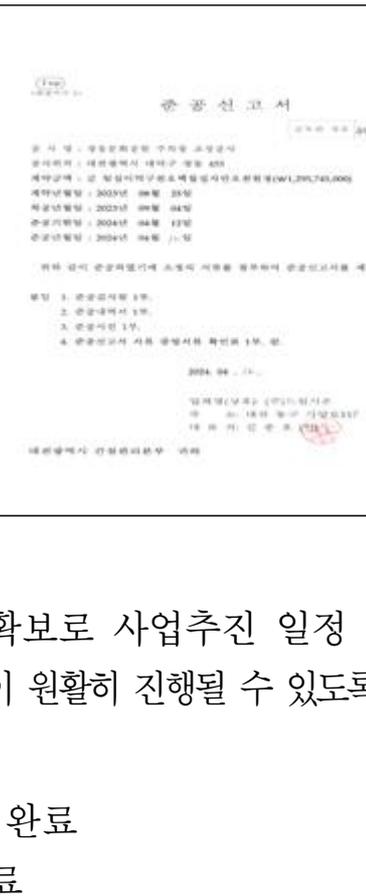
□ **공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비고	
연도별 사업추진	개소	목표	8	-	-	3	3	2	정상추진
		실적	3	-	-	3	-	-	

□ **추진실적 (24. 6월말 현재)**

그간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 계족산 자연휴양림 조성 <ul style="list-style-type: none"> - '23. 2.: 기본계획 및 실시설계 용역 착수 - '23. 4.: 기본계획 및 실시설계 용역 착수보고회 개최 ○ 장동문화공원 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 장동 도시생태축 복원사업 추진 / 완료 - 장동 생활공원 조성사업 추진 / 완료 - 장동문화공원 주차장 조성사업 착공(235면) / 완료 ○ 계족산 시민공원 임도 신설 착공 / 공정률 10%(문화재 시굴 완료)
----------	---

이번 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> - 장동 도시생태축 복원사업 추진 / 준공 - 장동 생활공원 조성사업 추진 / 준공
-------------	---

장동문화공원 주차장 조성공사 준공	 <p>장동문화공원 주차장 조성공사 준공</p>
--------------------	--

□ **문제점 및 대책**

- 계족산 자연휴양림 24년 본예산 미확보로 사업추진 일정 지연 우려
- ⇒ 토지보상비 등 사업비 확보하여 공약사업이 원활히 진행될 수 있도록 市와 지속적 협의

□ **향후 계획**

- 2024. : 계족산 시민공원 임도 개설 완료
- 2026. : 계족산 자연휴양림 조성 완료
